

# 团队工时分析报告

分析周期：2026-06-29 至 2026-07-05 | 美年健康研究院 数据平台部 | 2026-07-03



# 执行摘要

222.5h

总工时

6天

工作天数

18

涉及项目

6人

团队规模

本周数据平台部6名成员（含1名兼职）合计投入222.5小时，整体工时达标率良好。核心亮点是数据中台建设项目获得最高资源投入（59小时，26.5%），张治宇和王晓书专注度高，执行效率突出。然而，战略性工作占比约40%，支持/运营类事务占比超45%，战略聚焦度有待提升。


# 人员工时总览

| 姓名  | 类型 | 总工时   | 达成率    | 日均   | 任务数 |
|-----|----|-------|--------|------|-----|
| 魏超  | 全职 | 41.5h | 103.8% | 8.3h | 30  |
| 胡若玫 | 全职 | 41.0h | 102.5% | 8.2h | 11  |
| 李倩  | 全职 | 40.0h | 100.0% | 8.0h | 28  |
| 张治宇 | 全职 | 40.0h | 100.0% | 8.0h | 7   |
| 王晓书 | 全职 | 32.0h | 100.0% | 8.0h | 10  |
| 聂鑫  | 兼职 | 28.0h | 116.7% | 7.0h | 4   |


全员状态正常，无超负荷或低负荷人员。聂鑫作为兼职人员工时超标16.7%，需重点关注可持续性。

# 项目投入总览

## TOP 5 项目工时

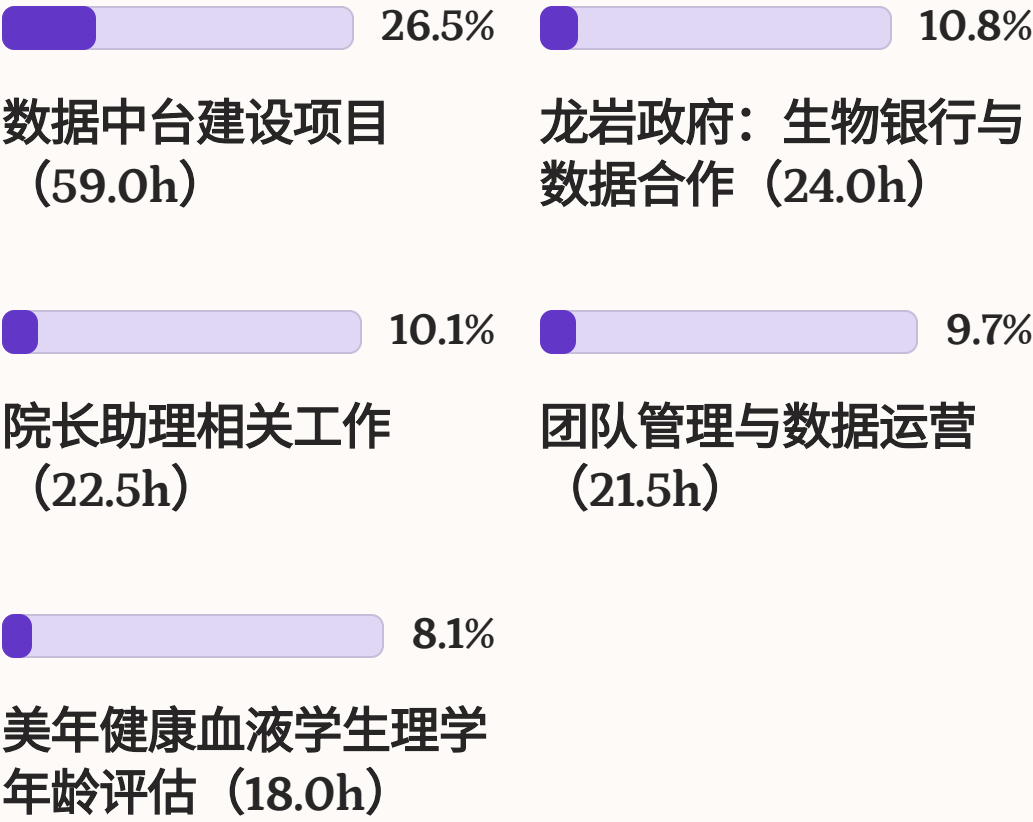

## 项目属性分布

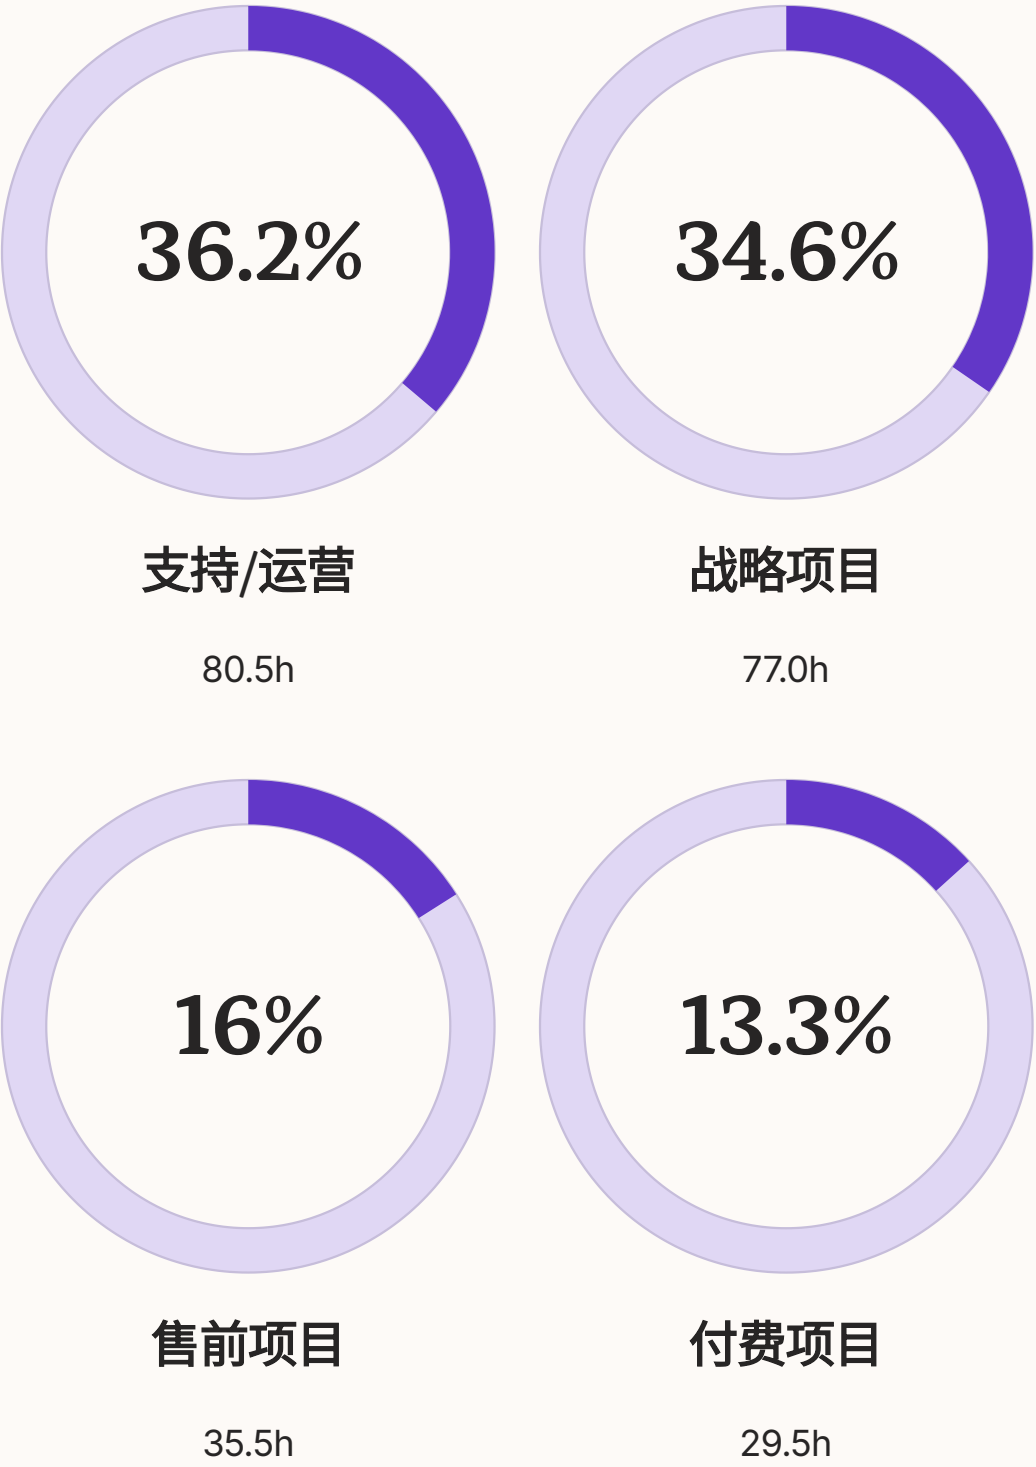

# 重点项目明细：数据中台建设（59.0h）

本周最高资源投入项目，由张治宇（40.0h）与王晓书（19.0h）主力承担，专注度极高。

## 张治宇（40.0h）

- DWD检验结果事实表全量导入与首轮质控（8.0h）
- 结构优化与问题闭环修复（8.0h）
- 检验维度字典建设 + 重抽取（8.0h）
- 2017-2024年历史数据专项修复：字段缺失、单位不统一、编码不一致等5类问题（6.0h）
- 索引优化与性能测试（6.0h）
- 数据目录问题梳理及编码规范（4.0h）

## 王晓书（19.0h）

- 检验字典初审问题修复及同步钉盘，调整物理结构（7.0h）
- 检验字典初审问题修复（6.0h）
- 整理问卷内容制作问卷字典（3.0h）
- 平台建设实施问题沟通与讨论（2.0h）
- 检查字典初审问题修复（1.0h）

# 重点项目明细：龙岩项目与院长助理

## 龙岩政府：生物银行与数据合作（24.0h）

### 胡若玫（14.0h）

龙岩数据平台方案优化与PPT制作（8.0h）；阶段性进展汇报与讨论修改（5.0h）；与龙岩毛总交流队列建设经验（1.0h）

### 聂鑫（8.0h）

协助进行龙岩项目方案撰写（8.0h）

### 魏超（2.0h）

提供过往队列项目材料及合规材料作为参考（2.0h）

## 院长助理相关工作（22.5h）— 魏超独承

- 接待杨福成教授团队来访（3.5h）
- 接待马敏老师、同仁医院董力博士来访（各2.0h）
- 整理研究院周例会会议纪要（2.0h）
- 接收科研团队季度汇报PPT并调整（2.0h）
- 组织召开研究院周例会（2.0h）
- 梳理来访客人信息、项目归档、更新商机表（2.0h）
- 对接山西针灸医院吕院长团队行程安排（2.0h）
- 其他行程协调与沟通（3.0h）

⚠ 魏超54.2%工时用于院长助理职能，严重偏离项目经理核心职责。

# 异常预警：四大风险信号



## 兼职超时 — 聂鑫

实际28h vs 标准24h，超出**16.7%**；周日（7月5日）工作8小时，存在过度使用风险，需评估可持续性。



## 周末出勤 — 胡若玫

周日全天出勤8小时参加国家数据局行业会议，属于隐性加班，长期持续可能影响工作状态。




## 角色错位 — 魏超

院长助理工作22.5h，占总工时**54.2%**，接待、行程安排、会议纪要等严重偏离项目管理核心职责。



## 未立项工时 — 胡若玫

周五4.0h记录为“未立项/临时指派”（陪同领导与杨越总团队交流），应归入具体项目，未立项标签掩盖实际内容。

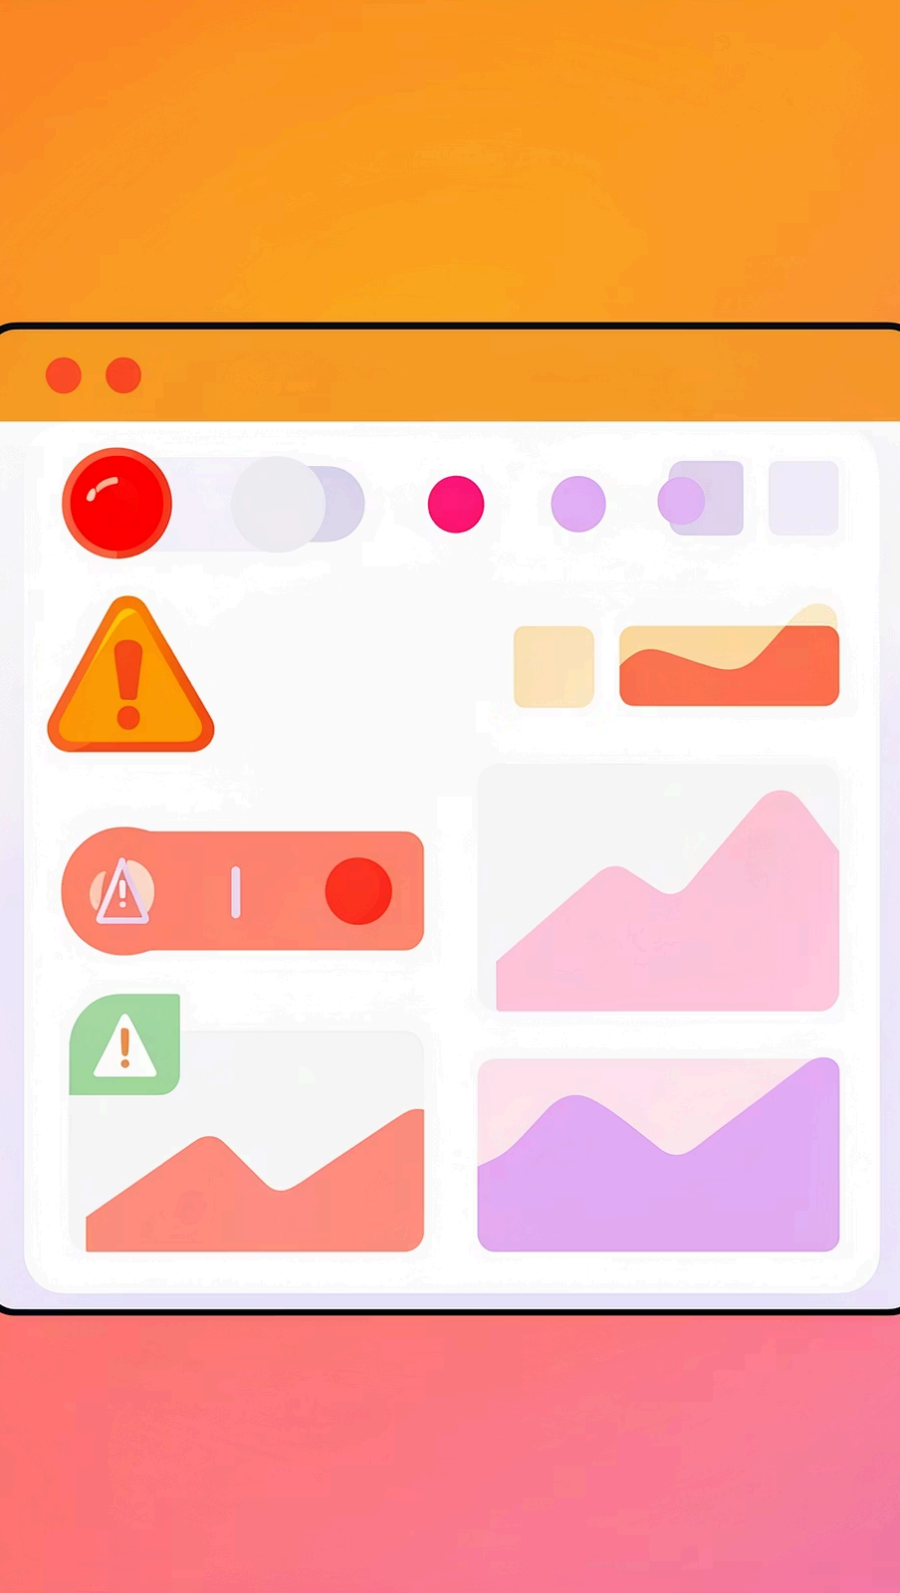

# AI洞察：战略聚焦度分析

## 战略 vs 运营比例

全周222.5小时中，战略项目77小时（34.6%），支持/运营类约101.5小时（45.6%），包括院长助理22.5h、团队管理21.5h、行政事务8.5h、平面设计12h、健康智谷12h等。**维持性事务占比显著偏高，挤压了战略投入空间。**

❏ 建议将非战略性事务占比压缩至30%以下。

## TOP3重点项目投入度

**数据中台 59h  
(26.5%)**

张治宇+王晓书主力，专注度高

**龙岩项目 24h  
(10.8%)**

三人协同，胡若玫单日8h制作PPT，存在高管亲自操刀执行层工作情况

**生理年龄 18h (8.1%)**

聂鑫贡献12h（兼职），依赖度较高

TOP3合计101小时，占总工时45.4%，资源集中度尚可。



# AI洞察：执行效率与碎片化



## 高专注度：张治宇 & 聂鑫

日均仅1.0个项目，平均任务时长分别为5.7h和7.0h，适合深度技术工作，执行效率突出。

## 高碎片化：魏超 & 李倩

日均切换4.0-4.2个项目（最高6个），平均任务时长仅**1.4小时**，频繁切换导致深度工作时间严重不足。魏超涉及9个项目，李倩涉及6个项目。



## 会议占比偏高

魏超接待类约7.5h（18%）+会议类约5.5h（13%）；胡若玫会议类工时占比约35%，需关注是否挤压战略思考时间。



# AI洞察：团队健康与单点依赖风险

## 单点依赖风险

**数据中台建设：**张治宇独立承担40h（67.8%），专注于DWD检验数据全链路建设，技术深度高但一旦缺席将严重影响项目进度。

**院长助理职能：**完全由魏超一人承担，占其工时54%，形成职能单点依赖。

## 工时记录质量问题

- 全部90条工时记录的 **project\_content** 字段均为空，缺失重要项目内容分类信息
- 李倩7月2日、3日研究院平面设计描述均被截断，无法了解具体工作内容
- 胡若玫4小时记录为"未立项/临时指派"，**未立项**标签掩盖实际工作内容

# AI洞察：财务与合规视角

## CapEx占比偏低

战略项目（可资本化）77h（34.6%）  
vs 支持/运营（费用化）101.5h  
（45.6%）vs 付费项目44h  
（19.8%）。对于以数据平台建设为核心  
职责的技术部门，资本化投入比例偏  
低，不利于资产积累和长期价值创造。

## 跨部门支持成本偏高

院长助理22.5h + 健康智谷12h + 未立  
项4h = **38.5h（17.3%）**，与数据平台  
部核心职责关联度较低，属于较高的跨  
部门支持成本。

## 售前投入需跟踪转化率

售前项目合计35.5h（15.9%）：龙岩  
24h（方案策划阶段，尚未签约）、国家  
数据局2026年8h（业务拓展性质）、中  
再保险3.5h（合同谈判阶段，转化预期  
较明确）。需建立转化率跟踪机制评估  
投入产出比。

# 下周工时安排预览

预计总工时：127.5小时（较本周减少约95小时，反映部分成员休假或工作量调整）

## 人员安排

| 成员  | 预计工时  |
|-----|-------|
| 张治宇 | 40.0h |
| 胡若玫 | 24.5h |
| 聂鑫  | 24.0h |
| 李倩  | 23.0h |
| 魏超  | 16.0h |

## 主要项目

| 项目名称             | 预计工时  |
|------------------|-------|
| 数据中台建设项目         | 40.0h |
| 龙岩政府：生物银行与数据合作   | 20.0h |
| 2025年度健康体检大数据蓝皮书 | 16.0h |
| 美年健康血液学生理学年龄评估   | 12.0h |
| 院长助理相关工作         | 11.0h |
| 研究院平面设计          | 11.0h |
| 医疗健康行业周报2026     | 11.0h |
| 健康智谷相关工作         | 3.0h  |

# 优化建议：高优先级行动项



## ● 重新定义魏超角色边界

剥离院长助理职能，将接待、行程安排等秘书性工作移交专职行政人员。预计可释放每周**15-20小时**有效工时，聚焦项目进度管理与商务推进。



## ● 实施时间块管理

为魏超和李倩设置固定深度工作时间块（如每天上午9-12点），同类工作合并处理。预计可将平均任务时长从1.4h提升至**2.5h**以上。



## ● 建立数据中台知识备份机制

要求张治宇每周产出技术文档，安排王晓书定期代码Review，建立项目技术Wiki，确保至少一人可接手核心模块，降低单点依赖风险。



# 优化建议：中低优先级行动项与总结

## ● 中优先级

### 1 明确李倩核心职能定位

本周平面设计30%+健康智谷PPT 30%+行政21%，公众号运营等核心内容运营几乎为零。明确本季度内容运营KPI，评估平面设计是否可外包。

### 2 提升工时记录质量

将project\_content设为必填字段，制定分类标准，对"未立项/临时指派"设置不超过总工时5%的上限，超出需管理层审批。

### 3 关注聂鑫兼职工时上限

明确每周工时上限，避免周末常态化工作；评估美年生理年龄项目工作量是否超出兼职承载能力，必要时补充全职资源。

## ● 低优先级

优化售前项目资源投入结构：建立售前项目投入产出跟踪表，设置工时预算上限，超出预算需评估项目可行性。胡若玫亲自制作PPT的工作模式建议调整，高管应聚焦战略方向和客户关系，执行层工作下沉给聂鑫或其他成员。

□ 整体建议：优化魏超角色定位，降低行政支持占比，强化战略项目资源集中度，将非战略性事务占比压缩至30%以下。
