

团队工时分析报告

美年健康研究院 数据平台部 · 分析周期：2026-09-28 至 2026-10-02

2026-10-23 发布

共 7 人 · 4 工作日

执行摘要

本周团队整体运转正常

144h

总工时

4天

工作天数

14个

涉及项目

7人

团队规模

本周（国庆假期前3个工作日）团队整体出勤正常。战略项目「科研数据中台」独占45.8%工时（66小时），是核心引擎。工程侧高度聚焦，执行质量良好。运营支持类事务合计占比约32%，碎片化程度较高，存在精力分散风险。

✅ 正常负荷

6 人

⚠️ 超负荷

0 人


📉 负荷偏低

1 人（李倩）


人员工时总览

姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
胡若玫	全职	24.0h	24.0h	100.0%	8.0h	4	✅ 正常
魏超	全职	24.0h	24.0h	100.0%	8.0h	14	✅ 正常
杨星	全职	24.0h	24.0h	100.0%	8.0h	3	✅ 正常
张治宇	全职	24.0h	24.0h	100.0%	8.0h	3	✅ 正常
王晓书	全职	16.0h	16.0h	100.0%	5.3h	4	✅ 正常
聂鑫	兼职	16.0h	14.4h	111.1%	8.0h	2	✅ 正常
李倩	全职	16.0h	24.0h	66.7%	8.0h	11	📉 偏低

项目投入分布

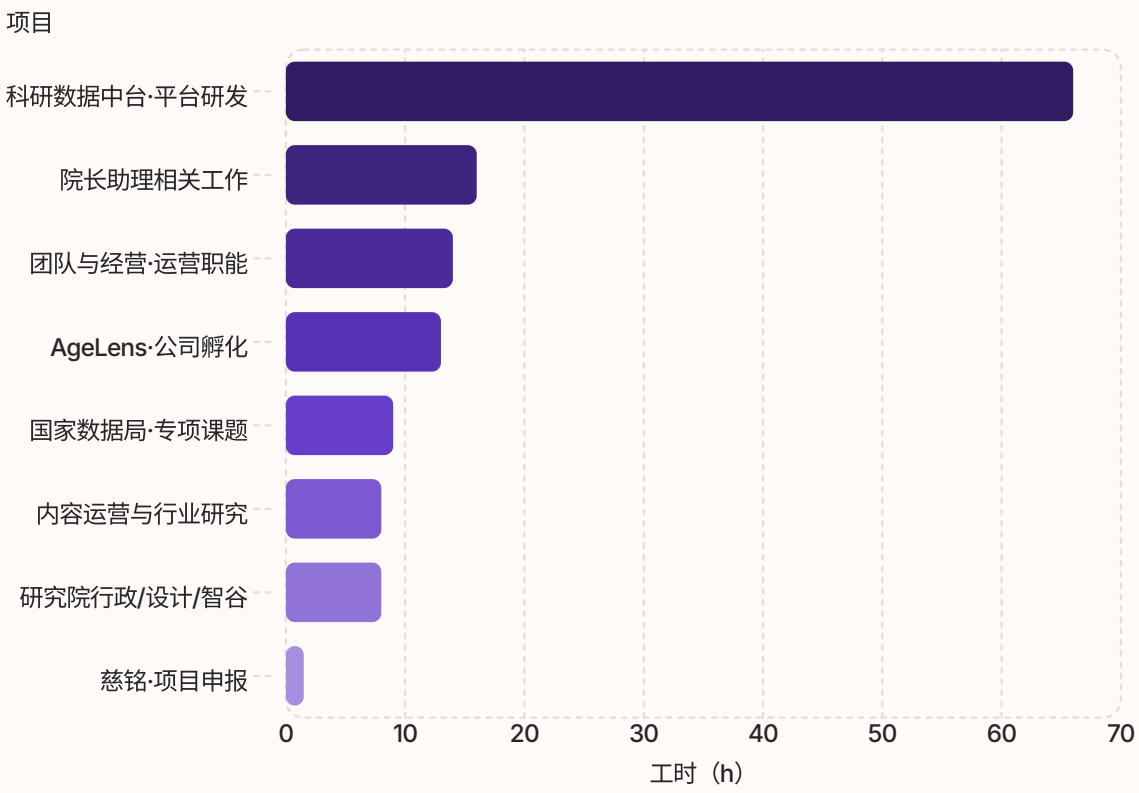


项目属性分布

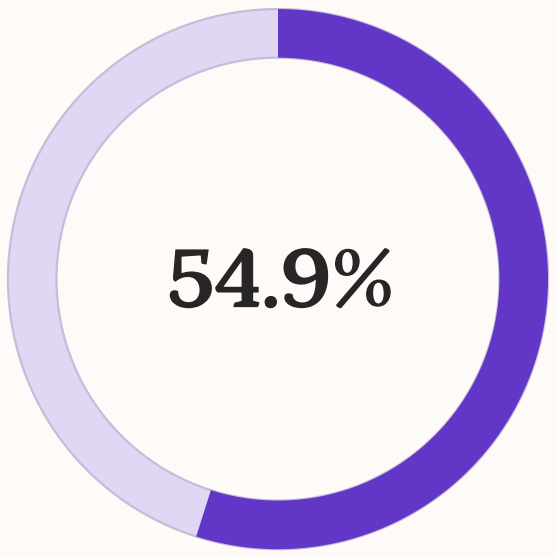


战略项目

79.0h

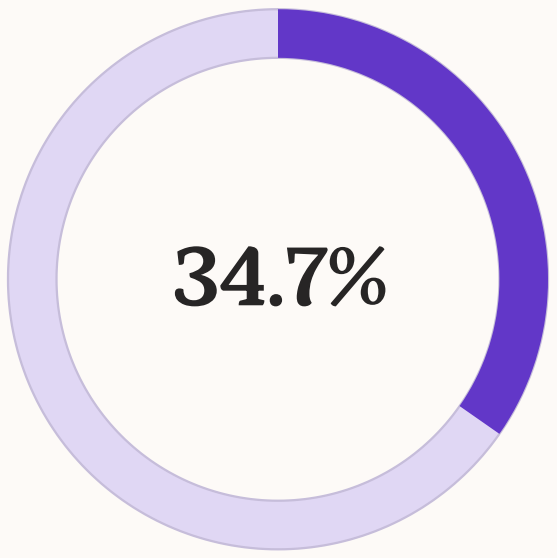


支持/运营

50.0h

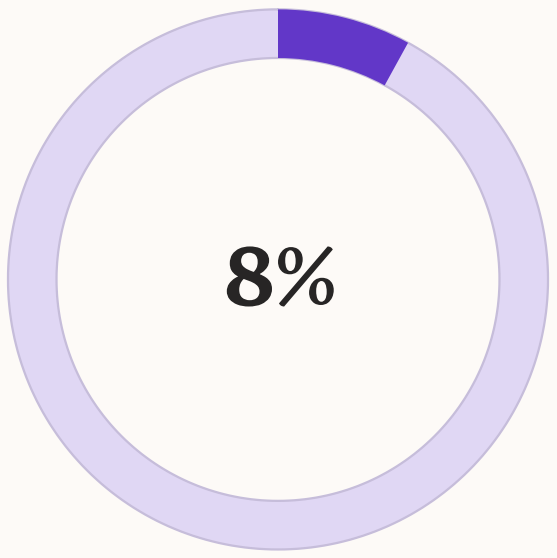

售前项目

11.5h

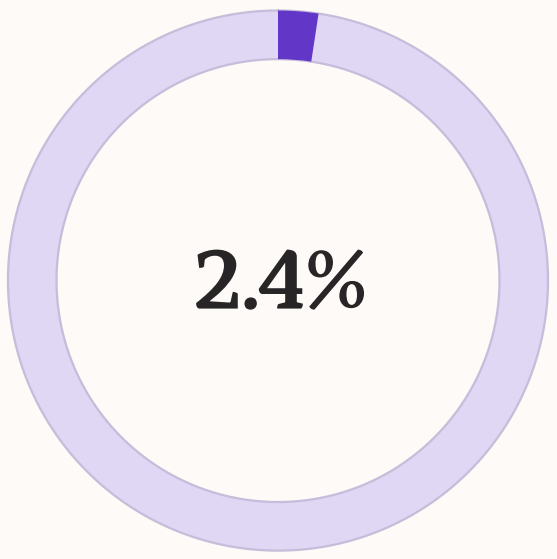

付费项目

3.5h



重点项目：科研数据中台（66.0h / 45.8%）

本周核心战略项目，4名成员持续投入，工程侧深度工作模式优秀。

张治宇（24.0h）

「字典管理」模块功能优化；将审核后的「检验」标准字典重新入库并归一匹配；开发「检查检验标准化抽查」页面原型设计。

杨星（24.0h）

检查标准化数据首轮抽查，同步测试字典平台功能；优化检查问题数据规则，补充缺失标准词。

王晓书（14.0h）

中台数据仓库新流程数据ETL构建及脚本编写部署（共14h）；数据中台字典匹配流程优化。

胡若玫（4.0h）

科研数据中台近期工作准备与汇报。

重点项目：运营与协调类

院长助理相关工作（16.0h）— 魏超

- 数据平台部近期工作汇报（4.0h）
- 梳理节前节后需衔接工作；整理项目文档（4.0h）
- 尝试打通「豆包-Notion」；整理过往项目材料（2.0h）
- 支持团队内部工具「研小笔」测试（2.0h）
- 梳理内部项目资料（资质/审计/制度等）（1.5h）
- 协助沟通美昱数据推送、西安合作机会等（2.5h）

团队与经营·运营职能（14.0h）

胡若玫（12.0h）：团队共享Agent开发与测试（研小笔）8.0h；口径卡设计与预填4.0h。

王晓书（2.0h）：中台项目阶段汇报。

⚠️ 魏超日均切换3个项目，最多5个，全周14条记录，碎片化偏高，存在精力分散风险。

AI 洞察：异常预警

1

🔴 工时偏低 — 李倩

实际16h / 标准24h，达成率**66.7%**。leave_days=0但出勤仅2天，工时缺口8小时原因不明，需确认是否漏报假期或工时填报遗漏。

2

🔴 碎片化异常 — 李倩

日均5个项目，7类任务，均值**1.5小时/任务**。任务粒度过细、切换频繁，涵盖行政、设计、项目跟进等差异大的工作类型，角色定位需明确。

3

🟡 碎片化偏高 — 魏超

日均3个项目，最多5个，均值**1.7小时/任务**，全周14条记录。协调职能带来高频切换，存在精力分散和优先级混乱风险。

4

🟡 轻度超时 — 聂鑫

实际16h / 标准14.4h，达成率**111.1%**。兼职人员轻度超标，内容为行业研究，本周为单次观察，关注是否持续。

AI 洞察

战略一致性分析

🟢 重点项目投入度

「科研数据中台」获得4人×3天持续投入（66h），张治宇、王晓书、杨星全量投入，资源配置高度集中。AgeLens孵化获13小时，涵盖行业研究（聂鑫）和工商事务（魏超），节前推进节奏合理。胡若玫亲赴朝阳区数据联盟交流会（8小时），体现高层资源投入。

🟡 战略 vs 支持比例

战略项目占**54.9%**，在节前3天短周期内属合理水平。然而支持/运营类事务合计**51小时（35.4%）**，比例偏高，主要集中于魏超和李倩。实际付费交付项目仅3.5小时（2.4%），反映本周以内建为主。

⚠ 建议假期后重新评估运营支持工时边界，降低碎片事务占比。



执行效率：深度工作 vs 碎片化

🟢 技术执行层（张治宇 / 王晓书 / 杨星）

日均**1个项目**，8小时/任务，深度工作模式优秀，适合平台研发的高专注需求，是本周效率亮点。

🟡 管理协调层（魏超）

日均**3个项目**，最多5个，院长助理事务占其工时大部分，存在无效切换风险，核心项目管理职能本周几乎未体现。

🔴 运营层（李倩）

日均**5个项目**，7类任务，平均每任务1.5小时，碎片化严重，难以形成有效产出积累，角色边界亟需厘清。

会议/协作类工时约12小时（8.3%），整体偏低但集中于周一汇报，属节前进度同步的正常安排。当前工时数据不含预估工时字段，无法进行偏差分析，建议后续补充。

团队健康与合规风险

🟢 负荷分布整体健康

聂鑫兼职本周投入16h，超标准14.4h约11%，属轻度超负荷，内容为知识密集型研究，尚在可接受范围。王晓书10-02有一条0小时记录，疑为误填，实际工时已按16小时正常统计。**无成员在法定假日有实质工时记录，节日休假执行良好。**

🟡 待核实项

- 李倩工时缺口8小时，leave_days=0但出勤仅2天，需确认是否漏报假期
- 魏超「院长助理相关工作」承载8条任务共16小时，内容跨度大，建议细化拆分
- 所有条目project_content字段均为空，损失一层分析维度

🟡 财务与合规：CapEx 认定

「科研数据中台·平台研发」属战略项目，张治宇、王晓书、杨星的开发和测试工时（约**50小时**）具有资本化潜力，建议财务核实CapEx认定标准。

跨部门支持成本约**20小时（13.9%）**：魏超院长助理职能16h + 李倩健康智谷设计4h，若未计入相应项目，将形成数据平台部的隐性支持成本。

> 建议建立内部服务计费或工时归属机制，显性化跨部门支持成本。

下周计划

预计总工时 160.5 小时

人员安排

成员	预计工时
胡若玫	24.5h
聂鑫	24.0h
王晓书	24.0h
李倩	24.0h
张治宇	24.0h
杨星	24.0h
魏超	16.0h

主要项目

项目名称	预计工时
科研数据中台·平台研发	66.0h
内容运营与行业研究	20.0h
美年+慈铭·健康体检大数据·蓝皮书	18.5h
美年集团·医疗健康行业·定期报告	14.0h
团队与经营·运营职能	14.0h
思齐圈及药企客户·专家标注	7.5h
院长助理相关工作	5.5h
国家数据局·数字化转型·专项课题	4.0h

立即行动项

1 核实李倩工时缺口

确认8小时缺口是否存在未登记假期或工时漏报，并在系统中补全记录。

2 重新梳理魏超任务边界

节后将「院长助理相关工作」拆分至「业务拓展支持」「内部运营工具」「项目资料管理」等子类，使项目管理职能可见。

3 强制填写 project_content 字段

将该字段设为必填项，提供标准化选项，驱动CapEx/OpEx自动分类，提升工时分析深度。

4 财务核实 CapEx 认定适用性

评估科研数据中台研发工时（约50小时）的资本化登记可行性。

5 制定 AgeLens 下阶段里程碑

节后明确聂鑫行业研究成果的交付形式和使用路径，将魏超工商推进事项转化为可追踪节点。

优化建议总览

优先级	类别	建议	预期效果
🔴 高	效率	推行魏超时间块管理，拆分「院长助理」大类项目；每日设置2小时固定协调时段	降低协调碎片化比例20-30%，使项目管理产出可见
🔴 高	健康	核查并规范李倩工时记录，明确角色边界，将行政事务归还对应负责人	提高工时记录准确性，使其聚焦核心运营职能
🟡 中	战略	为AgeLens孵化设立专项资源池（建议≥16h/周）和交付里程碑	加速AgeLens从孵化到可交付阶段的转化
🟡 中	财务	建立内部服务工时分摊机制，显性化跨部门支持成本	使数据平台部真实成本结构透明化
🟡 中	效率	强制填写project_content字段，提供标准化选项	支持更精准的战略一致性分析和财务分类
🟢 低	健康	关注聂鑫兼职工时上限，建立弹性工时预警（>120%触发提醒）	保障兼职人员可持续工作节奏

总结与展望

💪 本周亮点

技术执行层深度工作模式优秀；科研数据中台资源集中，推进有力；节日休假执行良好，无违规加班。

⚠️ 核心风险

李倩工时缺口待查；魏超与李倩碎片化显著；支持运营占比35%偏高；project_content字段全部为空。

🚀 下周重点

假期后重启科研数据中台（66h）；推进蓝皮书与定期报告；明确AgeLens里程碑；落实工时规范整改。

> 战略项目资源集中度高，核心平台研发获得充分保障。节后需重点关注运营支持边界优化与工时数据质量提升，为下一阶段高效执行奠定基础。

报告生成时间：2026-10-23 18:09:56 · 美年健康研究院 数据平台部

