

团队工时分析报告

分析周期：**2026年10月8日 — 10月11日** | 美年健康研究院 数据平台部 |

报告生成：2026-10-23

总工时

160.5 小时

工作天数

4 天

涉及项目

14 个

团队规模

7 人

执行摘要

本周（10月8–11日）为国庆节后短周，团队7名成员合计投入160.5小时，整体工时达成率良好。战略核心项目「科研数据中台·平台研发」以66小时（41.1%）位居首位，资源集中度高，体现清晰的战略聚焦；蓝皮书（2025年度）交付亦进入冲刺阶段。

⚠️ 聂鑫超负荷

兼职身份连续三天满负荷工作并在周日加班，达成率166.7%，可持续性存疑。

⚠️ 李倩碎片化

日均跨3.7个项目，大量承担财务对账等非本职行政事务，效率损耗明显。

⚠️ 其他关注点

魏超项目切换频繁；胡若玫周日加班0.5小时处理周报审核。

人员工时总览

姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	任务数	状态
胡若玫	全职	24.5h	24.0h	102.1%	7	✅ 正常
聂鑫	兼职	**24.0h**	14.4h	**166.7%**	3	⚠️ 超负荷
王晓书	全职	24.0h	24.0h	100.0%	5	✅ 正常
李倩	全职	24.0h	24.0h	100.0%	12	✅ 正常
张治宇	全职	24.0h	24.0h	100.0%	5	✅ 正常
杨星	全职	24.0h	24.0h	100.0%	3	✅ 正常
魏超	全职	16.0h	16.0h	100.0%	7	✅ 正常

项目投入总览

排名	项目名称	工时	占比
1	科研数据中台·平台研发	**66.0h**	**41.1%**
2	内容运营与行业研究	20.0h	12.5%
3	蓝皮书（2025年度）	18.5h	11.5%
4	美年集团·定期报告	14.0h	8.7%
5	团队与经营·运营职能	14.0h	8.7%
6	思齐圈·专家标注·数据服务	7.5h	4.7%
7	院长助理相关工作	5.5h	3.4%
8–10	其他项目	10.0h	6.2%

项目属性分布

战略项目：**66.0h（41.1%）**


支持/运营项目：**43.0h（26.8%）**

付费项目：**40.5h（25.2%）**

售前项目：**11.0h（6.9%）**


重点项目明细：科研数据中台·平台研发（66.0h / 41.1%）

本周最大战略项目，由王晓书、张治宇、杨星三名专业人员全力投入，人均约22小时，聚焦度极高。




王晓书（18.0h）

- DWS检查、检验主题构建（14.0h）
- 新数据推送流程ETL测试（4.0h）



张治宇（24.0h）

- 开发"检查检验标准化抽查"页面前后端及部署（12.0h）
- 归一结果抽查与问题修复（6.0h）
- ODS数据归档及字典表推送（6.0h）



杨星（24.0h）

- 检验标准化数据首轮抽查（16.0h）
- 优化检验问题数据规则、补充缺失标准词（8.0h）

重点项目明细：内容运营 & 蓝皮书冲刺

内容运营与行业研究（20.0h / 12.5%）

聂鑫（16.0h）

调研大模型标注与评测公司——业务模式（8.0h）+ 技术平台（8.0h）

胡若玫（4.0h）

为投资人提供美年体检数据应用典型案例

蓝皮书（2025年度）（18.5h / 11.5%）

魏超（8.0h）

对接广告排版、基金会露出、印刷版本区分及发布宣传细节（6.0h）；安排输出长图并沟通品牌中心（2.0h）

李倩（10.5h）

对接宣传长图设计需求并预排初稿（3.0h）；修改优化初稿设计稿（7.5h）

⚠️ 超负荷预警：聂鑫

24h

实际工时

标准仅14.4h

166.7%

达成率

严重超出兼职标准

8h

周日加班

10月11日（周日）

项目	工时	具体事项
内容运营与行业研究	16.0h	调研大模型标注与评测公司（业务模式+技术平台）
美年集团·定期报告	8.0h	医疗健康周报新闻采集及撰写（周日加班完成）

⚠ 兼职人员连续满负荷工作并在周末加班，可持续性存疑，需评估工作量安排或考虑调整用工模式。


AI 洞察：战略一致性分析

战略 vs 支撑比例

战略项目（科研数据中台）占比**41.1%**，付费项目合计约32%，两者合计超73%，方向正确。然而「支持/运营」类项目合计44小时（27.4%），包含团队运营职能14h、院长助理5.5h、行政事务1.5h、平面设计2h，这些非核心事务消耗了近1/4的团队产能，值得持续监控。

重点项目投入度

TOP1战略项目「科研数据中台」三名专业人员全力投入，平均每人约22小时，聚焦度高。蓝皮书2025年度处于冲刺阶段，魏超+李倩合力推进18.5小时。龙岩生物银行（售前高优先级）仅投入4小时，属阶段性接触，暂不构成问题。

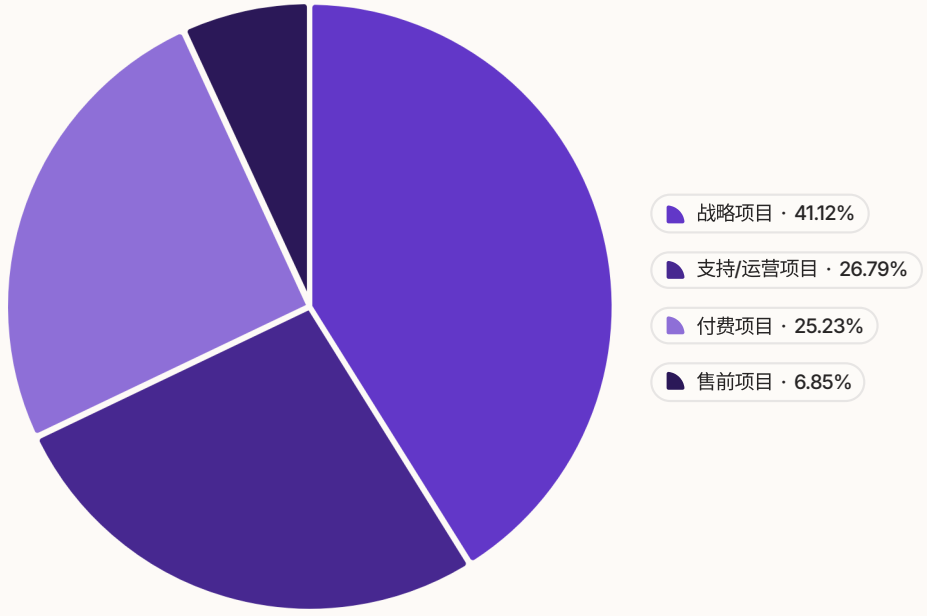

AI 洞察：执行效率与碎片化分析

🔴 李倩（高度碎片化）

日均3.7个项目，最高单日5个，平均任务时长仅2.0小时。任务横跨财务对账、平面设计、行政报销、项目跟进、内容运营，职责边界模糊，与内容运营经理定位不符。


🟡 魏超（多线切换）

日均3个项目，任务时长2.3小时，承担项目管理、客户对接、院长助理等多条线任务，上下文切换成本较高。

🟢 技术人员（高聚焦）

张治宇、杨星、聂鑫日均仅1个项目，专注度极高，有利于深度工作，是本周深度工作的主力。

管理层会议占比合理：魏超周例会+Q3汇报约5.5h（34%），技术人员会议负担轻，保障了深度开发工时。

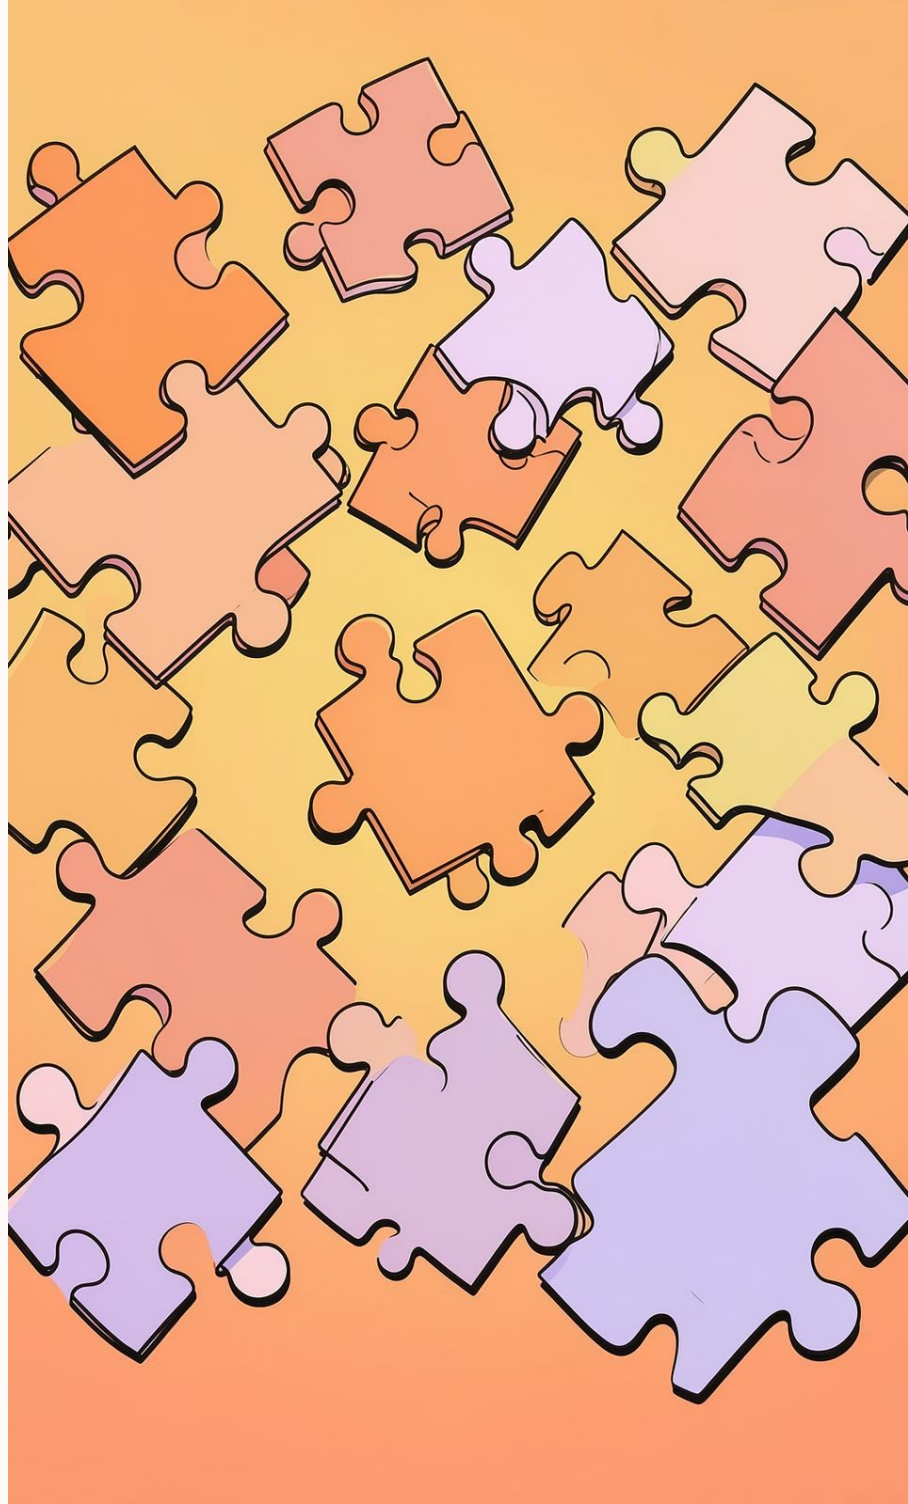

AI 洞察：团队健康与合规风险

🔴 隐性加班与超负荷

聂鑫本周三天每天工作8小时，周日再加班8小时，合计24小时，为标准工时14.4小时的**166.7%**，已被系统标记为超负荷。兼职人员长期超负荷存在可持续性风险，周日赶稿模式暗示任务规划存在压力。胡若玫周日审核0.5小时属轻度加班，影响较小。

🟡 工时归属错配

李倩在「思齐圈·专家标注·数据服务」项目下记录了7.5小时，但实际内容均为财务对账、单据填写、OA发起付款等财务行政事务，与项目名称严重不符，影响项目成本核算准确性。

🟢 CapEx资本化潜力

「科研数据中台·平台研发」属自建软件平台，本周开发工时合计**66小时**，涉及数据仓库建设、ETL开发、前后端开发等典型资本化活动，具有较高CapEx资本化潜力。建议财务部门结合项目阶段判断是否满足资本化条件。

🟢 跨部门支持成本

胡若玫为投资人提供数据应用案例支持4小时，具有战略价值。整体跨部门支持成本处于可控范围，不构成资源浪费。

下周工时安排预览

301.5h

预计总工时

较本周大幅提升

116h

科研数据中台

下周最大投入项目

34.5h

蓝皮书冲刺

2025年度持续推进

33.5h

院长助理工作

下周新增重点

人员安排

成员	预计工时
魏超	62.0h
李倩	44.0h
胡若玫	43.5h
杨星	40.0h
王晓书	40.0h
张治宇	40.0h
聂鑫	32.0h

主要项目

项目	预计工时
科研数据中台·平台研发	116.0h
蓝皮书（2025年度）	34.5h
院长助理相关工作	33.5h
生理年龄评估AgeLens·孵化	25.0h
内容运营与行业研究	24.0h
健康智谷相关工作	9.0h



立即行动项

1 与聂鑫沟通超负荷原因

评估是否需要调整工作量、增加支持资源（如引入另一名兼职分析师）或重新规划用工模式；将周报任务节奏前置，避免周末赶稿。

2 规范李倩工时填报

将财务对账、OA报销等行政事务从「专家标注·数据服务」项目中剥离，归入「行政事务」类别，确保项目成本核算准确。

3 推动工时系统升级

增加「预估工时」字段，支持计划-实际偏差分析；增加「CapEx/OpEx」标签字段，支持平台研发工时资本化认定。

优化建议总览

优先级	类别	建议	预期效果
🔴 高	健康	制定兼职人员工时上限机制，防止聂鑫持续超负荷	降低离职或质量下滑风险，提升行业研究交付可持续性
🔴 高	效率	重新界定李倩职责边界，减少非本职行政事务占用	预计可将李倩有效产出时间提升30%以上
🔴 高	合规	纠正工时归属错配，规范项目工时填报标准	提升项目成本核算准确性，支持可靠的盈利分析
🟡 中	效率	优化魏超任务集中度，减少低价值项目切换	减少上下文切换损耗，提升核心项目管理专注度
🟡 中	战略	建立CapEx工时认定机制，优化平台研发财务处理	合理优化财务报表结构，提升资产账面价值
🟢 低	效率	工时系统增加预估工时字段，支持计划-实际偏差分析	提升项目计划精度，为资源分配决策提供数据基础



总结与展望

本周团队整体工时达成率良好，战略核心项目资源集中，方向正确。核心技术人员执行模式高效聚焦，是深度工作的主力。

✅ 本周亮点

科研数据中台占比41.1%，三名技术人员高度聚焦；蓝皮书冲刺按计划推进；整体工时达成率良好。

⚠️ 核心风险

聂鑫超负荷166.7%需立即干预；李倩碎片化严重影响效率；工时归属错配影响成本核算。

🚀 下周重点

总工时预计301.5小时，科研数据中台持续主导（116h）；AgeLens孵化项目新增25小时投入值得关注。

报告生成时间：2026-10-23 18:14:49 | 美年健康研究院 数据平台部
