

团队工时分析报告

分析周期：2026-10-12 至 2026-10-18 | 美年健康研究院 数据平台部 | 报告日期：2026-10-23

执行摘要

本周核心数据一览

301.5h

总工时

7天分析周期内全团队累计投入

16

涉及项目

跨多个战略与付费项目

7

团队规模

全职6人 + 兼职1人

46.8%

战略项目占比

科研数据中台 + AgeLens 合计

> 战略方向明确，付费项目以蓝皮书交付为主驱动；核心问题集中在魏超超负荷、周末加班普遍及支持/运营类项目资源稀释三点。工程团队节奏稳健，是本周执行亮点。

团队状态

人员工时总览

姓名	类型	总工时	达成率	日均	任务数	状态
魏超	全职	62.0h	155%	8.9h	29	⚠️ 超负荷
李倩	全职	44.0h	110%	7.3h	28	✅ 正常
胡若玫	全职	43.5h	108.7%	6.2h	8	✅ 正常
杨星	全职	40.0h	100%	8.0h	5	✅ 正常
王晓书	全职	40.0h	125%	8.0h	5	⚠️ 超负荷
张治宇	全职	40.0h	100%	8.0h	9	✅ 正常
聂鑫	兼职	32.0h	133.3%	8.0h	4	⚠️ 超负荷

✅ 正常负荷

4 人

⚠️ 超负荷

3 人


📉 负荷偏低

0 人

项目投入

项目属性分布与 TOP 项目

项目属性分布

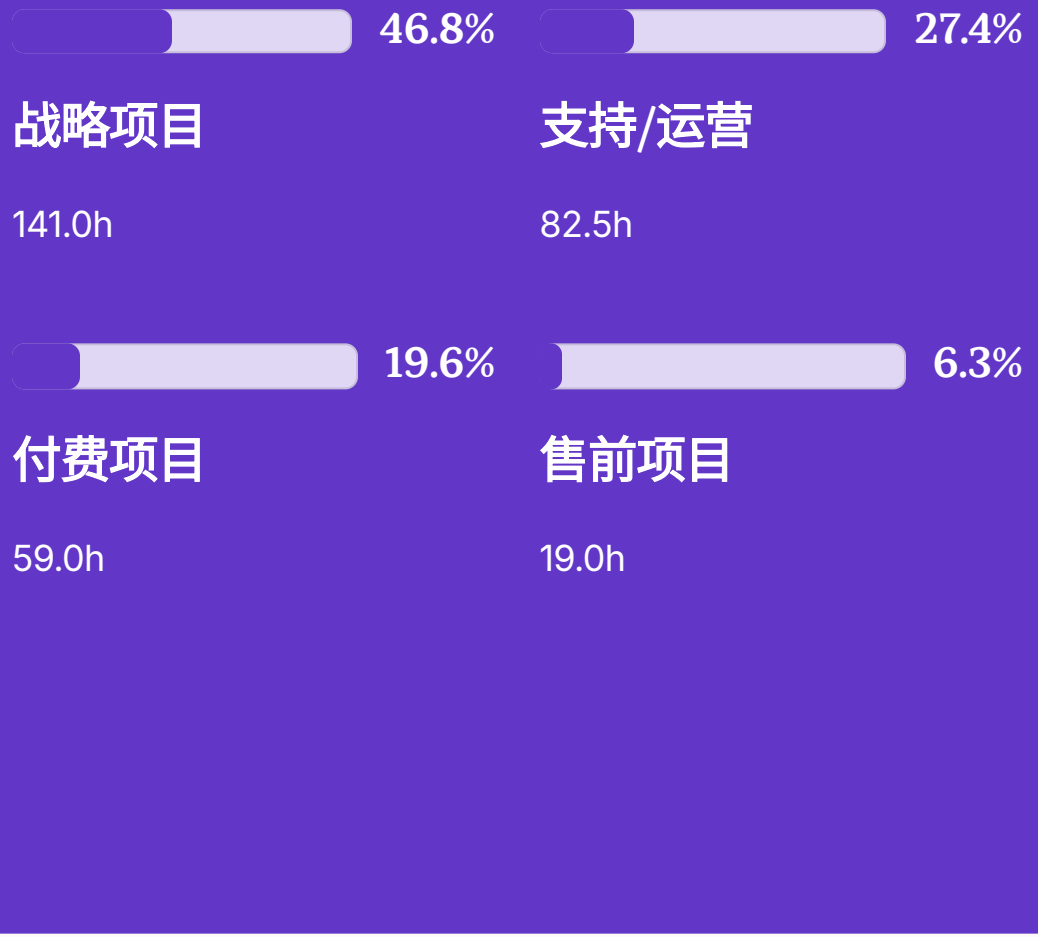

TOP 5 项目工时

科研数据中台

116.0h | 38.5% | 3人

蓝皮书（2025年度）

34.5h | 11.4% | 2人

院长助理相关工作

33.5h | 11.1% | 1人

AgeLens 公司孵化

25.0h | 8.3% | 3人


内容运营与行业研究

24.0h | 8.0% | 2人

重点项目明细


科研数据中台平台研发（116.0h / 38.5%）

本周最大单项目，由张治宇、王晓书、杨星三人高强度推进，聚焦度极高。



杨星（40.0h）

全周聚焦检查检验标准化数据回归验证与数据抽查，优化检查问题数据规则，补充缺失标准词。



王晓书（40.0h）

完成新数据推送流程ETL测试、数据平台数据目录设计、202607新数据抽取入ODS及自主查询模块设计。



张治宇（36.0h）

主导"自助查询"模块前后端开发、联调测试与功能优化；完成2026年体检结果表（12亿条）等多类数据抽取至科研团队服务器。

重点项目明细

蓝皮书发布冲刺 & 院长助理工作

蓝皮书（2025年度）— 34.5h

1 魏超（16.0h）

出差济南参加蓝皮书现场发布，与集团品牌中心沟通宣传内容，跟进领导行程、PPT及宣传材料。

2 李倩（18.5h）

配合蓝皮书各类设计稿微调、修改及导出，应客户与印厂需求进行封面、内页合规修改，核对终版差异并提交源文件。

院长助理相关工作 — 33.5h（魏超独承）

- 整理研究院Q3汇报材料并校对（4.0h）
- 修改更新过往交付项目说明材料（4.0h）
- 梳理经营数据，准备院长汇报材料（3.0h）
- 接待中日医院来访、沟通安贞四方协议（4.0h）
- 参加季度述职汇报会并整理会议纪要（2.0h）
- 对接中日友好医院签约会及新员工入职事宜（2.0h）

院长助理事务占魏超总工时约54%，严重挤压项目管理核心职能。

⚠️ 超负荷预警

三位超负荷成员详析

魏超 — 62.0h | 达成率155%


连续7天工作，周六4h出差济南、周日8h参加发布会，全周无休息日。院长助理事务占54%，与项目经理主责严重错位，长期持续将引发离职或健康风险。

王晓书 — 40.0h | 达成率125%

本周请假1天（标准工时调整为32h），但实际工时仍达40h，相当于4个工作日完成40h工作，日均10h，存在隐性加班。

聂鑫（兼职） — 32.0h | 达成率133%

兼职标准工时24h，本周超出33%，且周日独立完成8h医疗健康周报。需确认是否为临时冲刺还是常态，避免隐性全职化。

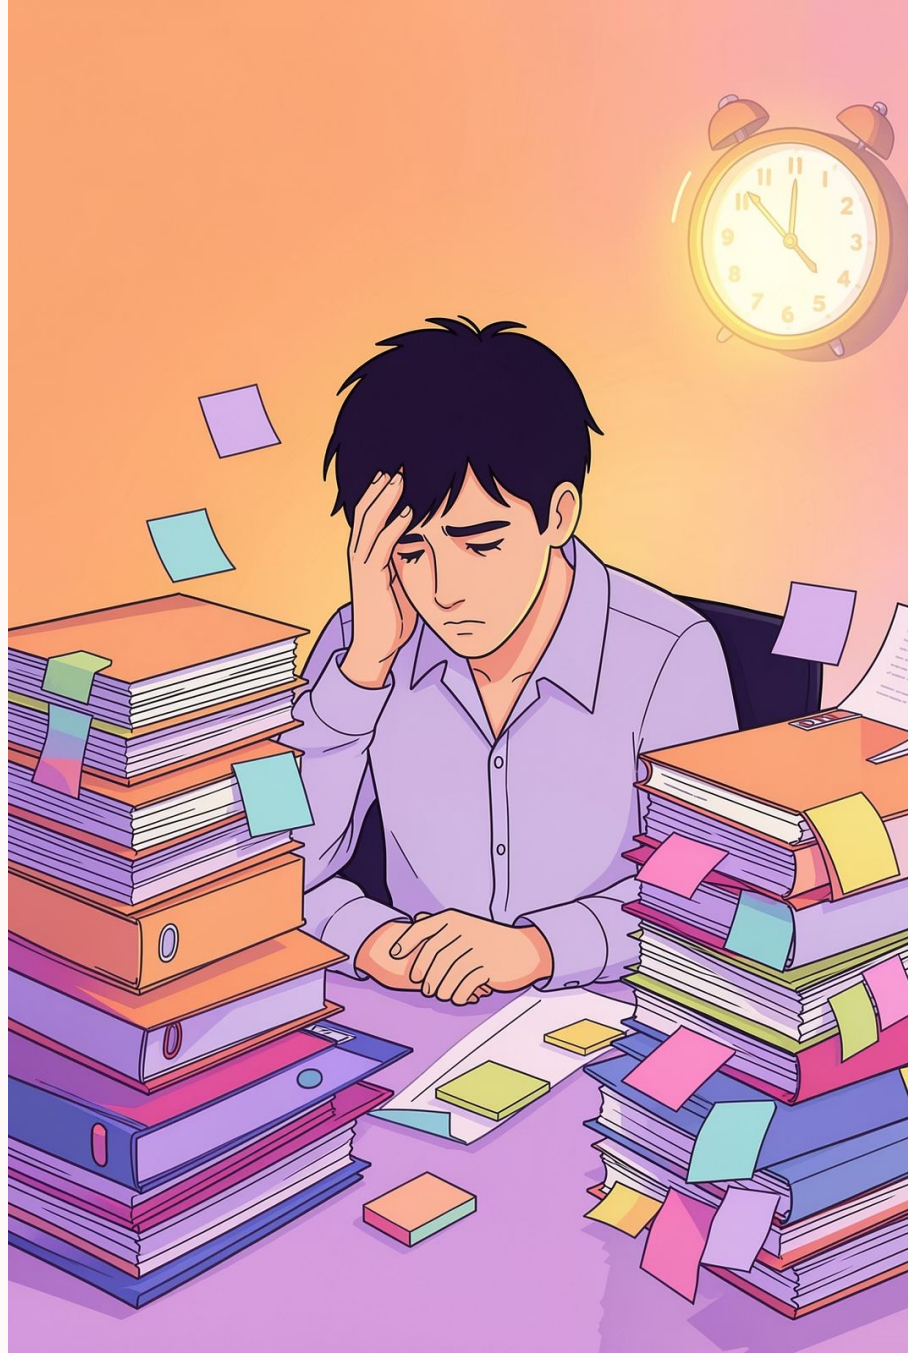

AI 洞察 · 战略一致性


战略项目聚焦度分析

🟡 战略 vs 琐事比例

战略项目141h（46.8%）方向清晰；但支持/运营类81h（26.9%）占比偏高，主要集中在魏超院长助理工作（33.5h）、健康智谷支持及内容运营，存在资源稀释风险。李倩的行政事务与健康智谷设计支持亦属低战略价值投入。

🟢 重点项目投入度

TOP3高优先级项目（科研数据中台116h + 蓝皮书34.5h + AgeLens 25h）合计175.5h，占总工时58.2%，资源配置整体合理。龙岩生物银行（售前阶段）本周仅9h、2人参与，后续需关注推进节奏。

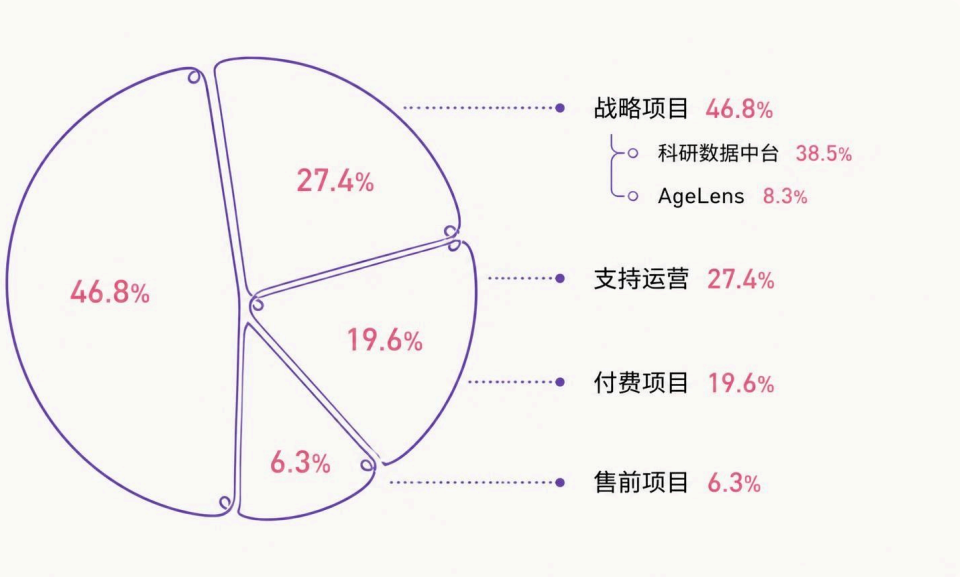

AI 洞察 · 执行效率

碎片化程度与执行模式对比

🟡 李倩（高度碎片化）

日均跨越3.5个项目，最高5个，平均任务时长仅1.6h，周内涉及7类工作（蓝皮书设计、健康智谷PPT、思齐圈账款、行政事务、美年周报等），深度工作空间被严重压缩。

🟡 魏超（协调沟通成本高）

日均2.6个项目，接待、沟通、行程对接等协作型任务估算累计8-10h，占总工时13%-16%，加上院长助理职能，实际用于项目管理核心产出的时间被严重压缩。

🟢 工程师团队（高度聚焦）

张治宇、王晓书、杨星日均仅1.0-1.2个项目，平均任务时长4.4-8h，聚焦度极高，是本周执行效率亮点。聂鑫碎片化同样极低。

预估 vs 实际偏差：工时数据不含预估工时字段，无法进行偏差分析。建议在工时系统中增加预估工时录入，以便后续评估执行准确率。

AI 洞察 · 健康与合规

团队健康风险：周末加班与单点依赖

🔴 周末加班汇总

魏超

周六4h + 周日8h = 12h（出差济南参加蓝皮书发布）

聂鑫

周日8h（独立完成医疗健康周报）

李倩

周六3h（客户临时需求驱动）

胡若玫

周六1h + 周日2.5h（述职会与专题研讨会）

🔴 单点依赖风险

魏超同时承担院长助理+项目经理双重职能，院长助理类工作占其工时约54%。一旦魏超请假或离职，将产生严重的知识断层和执行风险。

🟡 数据透明度不足

88条工时记录中，project_content字段全部为空，降低了工时数据的分析价值。部分任务描述较为笼统，需提升填写规范性。



AI 洞察 · 财务合规

资本化潜力与跨部门成本归属

🟢 资本化工时分析

科研数据中台（116h）属于软件平台研发性质，按企业会计准则，满足技术可行性、有意图完成且有能力使用等条件的开发阶段支出可予以资本化（CapEx）。AgeLens孵化项目（25h）同理。两者合计141h，占总工时46.8%。建议财务部门结合项目研发阶段判断是否满足资本化条件，以优化财务报表结构。付费项目（58.5h）直接对应收入，投入产出关系清晰。

🟡 跨部门支持成本（约57.5h / 19%）

院长助理工作

33.5h — 应归属管理费用而非项目成本，建议单独设立成本中心

运营职能

11.0h — 胡若玫承担，属组织级支持性投入

健康智谷支持

9.0h — 对外部关联方支持，成本承担方需明确

研究院行政事务

4.0h — 低战略价值，建议明确归属

下周计划

下周工时安排（预计 271.5h）

人员预计工时

成员	预计工时
王晓书	46.0h
胡若玫	41.5h
杨星	40.0h
李倩	40.0h
张治宇	40.0h
魏超	**32.0h ↓**
聂鑫	32.0h

主要项目预计工时

项目名称	预计工时
科研数据中台 · 平台研发	116.0h
龙岩 · 未来健康生物银行	32.0h
研究院行政事务	22.5h
院长助理相关工作	21.5h
医疗健康行业定期报告	20.0h
运营职能	19.5h
AgeLens · 公司孵化	17.5h
蓝皮书（2025年度）	9.5h

立即行动项

⚠️ 异常预警与紧急行动

1

【紧急】安排补休，落实补偿机制

为魏超、李倩、胡若玫、聂鑫安排蓝皮书发布后的补休，确认周末加班补偿机制是否落实。本周四人合计周末工时达26h。

2

【高优】重新审视魏超岗位职责边界

院长助理事务是否可部分转移给行政支持岗或由李倩承接，释放魏超的项目管理产能，将其KPI聚焦于项目交付与商务推进。

3

【高优】明确聂鑫兼职工作边界

本周32h已超标准24h的33%，若需长期维持高工时应考虑调整用工形式，避免隐性全职化带来的合规风险。

4

【中优】完善工时系统填写规范

要求团队成员填写project_content字段；评估健康智谷支持工作的成本归属，明确是否由对方承担相应人力成本。

优化建议

六大优化建议总览

🔴 魏超职责减负

盘点院长助理任务，识别可下放事项，预计提升有效工时利用率20-30%，降低离职与健康风险。

🔴 周末加班管理制度

明确补休/补偿政策，在项目计划阶段识别冲刺风险窗口，将冲刺成本纳入项目复盘。

🔴 优化李倩任务结构

推行时间块管理，区分主责与临时支持任务，预计提升有效产出时间15-20%。

🟡 明确聂鑫兼职定位

确认超时是否为常态，若持续超标则评估转为全职或提高兼职费用，保障合规性。

🟡 科研中台资本化评估

联合财务与法务评估116h研发工时的资本化可行性，同步评估AgeLens项目，优化财务报表结构。

🟡 内容运营战略定位

明确内容运营与行业研究的战略闭环路径，减少无闭环研究消耗，强化对核心战略项目的智识支撑。
