

团队工时分析报告

美年健康研究院 数据平台部 · 分析周期：2026-10-19 至 2026-10-25

2026-10-23 数据平台部

执行摘要

271.5h

总工时

6

工作天数

13

涉及项目

7

团队规模

本周数据平台部全团队总工时271.5小时，7名成员整体出勤良好。战略与付费项目合计占比约74%，资源配置方向基本正确，核心战略项目获得充足投入。

✅ 正常负荷

4 人

⚠️ 超负荷

3 人

📉 负荷偏低

0 人

🔄 按需工作

0 人

人员工时总览

姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
王晓书	全职	46.0h	32.0h	143.8%	9.2h	10	⚠️ 超负荷
胡若玫	全职	41.5h	40.0h	103.8%	6.9h	10	✅ 正常
杨星	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	9	✅ 正常
李倩	全职	40.0h	40.0h	100.0%	8.0h	29	✅ 正常
张治宇	全职	40.0h	32.0h	125.0%	8.0h	5	⚠️ 超负荷
魏超	全职	32.0h	32.0h	100.0%	8.0h	21	✅ 正常
聂鑫	兼职	32.0h	24.0h	133.3%	10.7h	4	⚠️ 超负荷

项目投入总览

TOP 10 项目工时投入

项目名称	工时	占比
研究院 · 科研数据中台 · 平台研发	116.0h	42.7%
龙岩市政府 · 未来健康生物银行	32.0h	11.8%
研究院行政事务	22.5h	8.3%
院长助理相关工作	21.5h	7.9%
美年集团 · 医疗健康行业 · 定期报告	20.0h	7.4%
研究院 · 团队与经营 · 运营职能	19.5h	7.2%
研究院 · AgeLens · 公司孵化	17.5h	6.4%
美年+慈铭 · 健康体检大数据 · 蓝皮书	9.5h	3.5%
思齐圈及药企客户 · 专家标注	7.0h	2.6%
国家数据局 · 数字化转型 · 专项课题	2.0h	0.7%

项目属性分布

49.2%

战略项目

133.5h

24.1%

支持/运营

65.5h

14.7%


付费项目

40.0h

12%

售前项目

32.5h

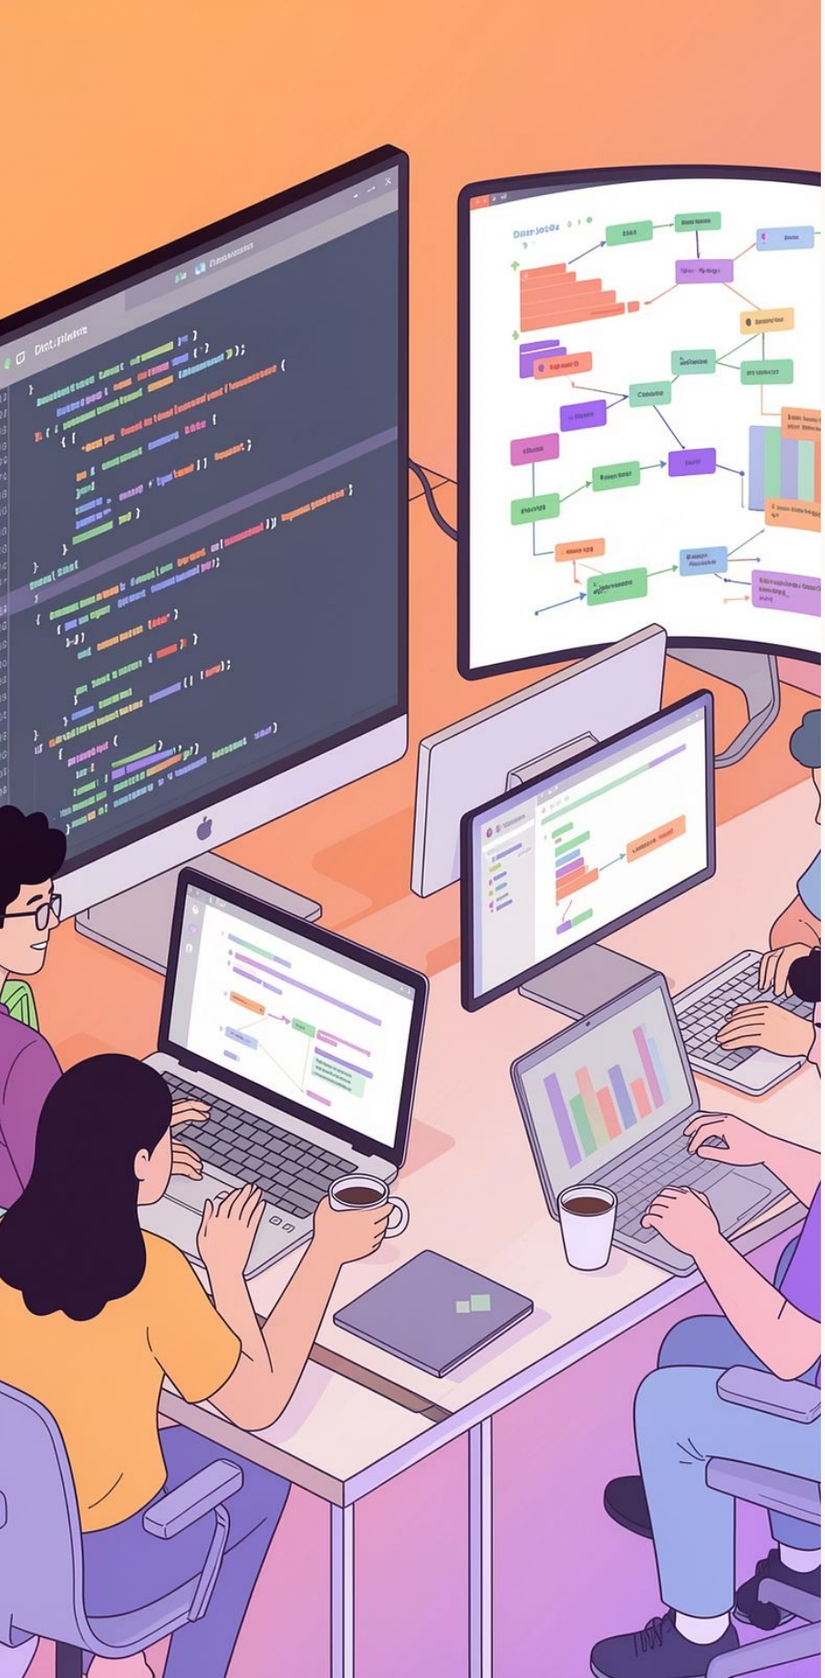

重点项目明细：科研数据中台（116.0h / 42.7%）

王晓书（38.0h）

ETL开发优化（8h×2）、数据目录设计及开发（8h）、ETL+指标开发流程优化（8h+6h）、指标开发规则优化与字典融合（4h）、字典匹配流程优化（2h）

张治宇（40.0h）

同义词匹配逻辑修改及验证（8h×2）、修复检查检验事实表错误归类数据（8h）、字典管理匹配逻辑优化统一后台表（8h）、新数据接入增量原始词入库流程开发（8h）

杨星（37.0h）

第二轮数据抽查问题修复（8h+5h）、蓝皮书指标梳理与判定规则整理（8h）、标准字典维护（5h）、数据抽查方案调整（4h）、指标规则文档与字典映射（2h）

胡若玫（1.0h）

参加集团关于数据资产的研讨会（1h）

重点项目明细：龙岩生物银行 & 行政事务

龙岩市政府 · 未来健康生物银行（32.0h / 11.8%）

胡若玫（24.0h）

龙岩项目专题研究与汇报材料准备（8h）；龙岩出差进展汇报两次（8h×2），本周实质成为龙岩项目主导者。

聂鑫（8.0h）

龙岩项目专题研究（8h）

研究院行政事务（22.5h / 8.3%）— 李倩

- PPT素材库持续建设与风格约束（9.5h）
- 合规文件及营销工具包整理备份（3h）
- 中国抗衰老促进会会员申请材料（2h）
- 协助财务编辑合规材料（2h）
- OA报销流程发起及单据递交（1h）
- 四方战略合作协议盖章寄出（1h）
- 合同审批发起与跟进（1h）

⚠ 李倩本周29个任务条目，核心职能（公众号运营、平面设计）几乎无产出。

⚠️ 超负荷人员深度分析

王晓书 · 全职 · 46.0h · 143.8%

请假1天仍产出46小时。科研数据中台38h（7项任务）+ 运营职能6h（培训+例会）+ 未立项2h（与算法沟通数需求）。**周五出现同项目两条记录共14小时**，疑似填报合并或实际超时，需核实。

张治宇 · 全职 · 40.0h · 125.0%

请假1天，标准工时32h，实际完成40h。全周100%专注科研数据中台（5项任务，每日满负荷8h），**无任何缓冲空间**，形成知识单点依赖，技术骨干长期高压存在可持续性风险。

聂鑫 · 兼职 · 32.0h · 133.3%

3个工作日完成32小时，日均10.7h。**周日单日工作16小时**（美年月报撰写+AgeLens周报），属明显非工作时间高强度投入，存在劳动合规风险，反映月报交付压力集中于非工作日。

下周工时安排预览

人员预计工时

成员	预计工时
张治宇	40.0h
王晓书	40.0h
胡若玫	28.0h
杨星	16.0h
聂鑫	16.0h
李倩	2.5h

预计总工时：**142.5 小时**

主要项目安排

科研数据中台 · 平台研发

94.0h — 下周最大投入方向，持续推进ETL与字典优化

AgeLens · 公司孵化

20.0h — 较本周显著提升，需明确里程碑

团队与经营 · 运营职能

18.0h — 常规运营维持

美年集团 · 医疗健康行业 · 定期报告

10.5h — 月报持续交付

AI 洞察：异常值警报

🚨 王晓书 — 工时超负荷（143.8%）


请假1天仍工作46小时，周五出现两条同项目记录共14小时，疑似工时填报合并或实际超时加班，**需核实数据准确性并关注身心负荷。**

🚨 聂鑫 — 超负荷+周末加班（133.3%）

兼职人员周日连续工作16小时，属明显非工作时间高强度投入，**存在劳动合规风险**，反映美年月报交付压力集中在非工作日。

🚨 张治宇 — 工时超负荷（125.0%）

请假1天但完成40小时，每日满负荷8小时，全周无缓冲。**技术骨干长期高压运作存在可持续性风险**，且形成知识单点依赖。

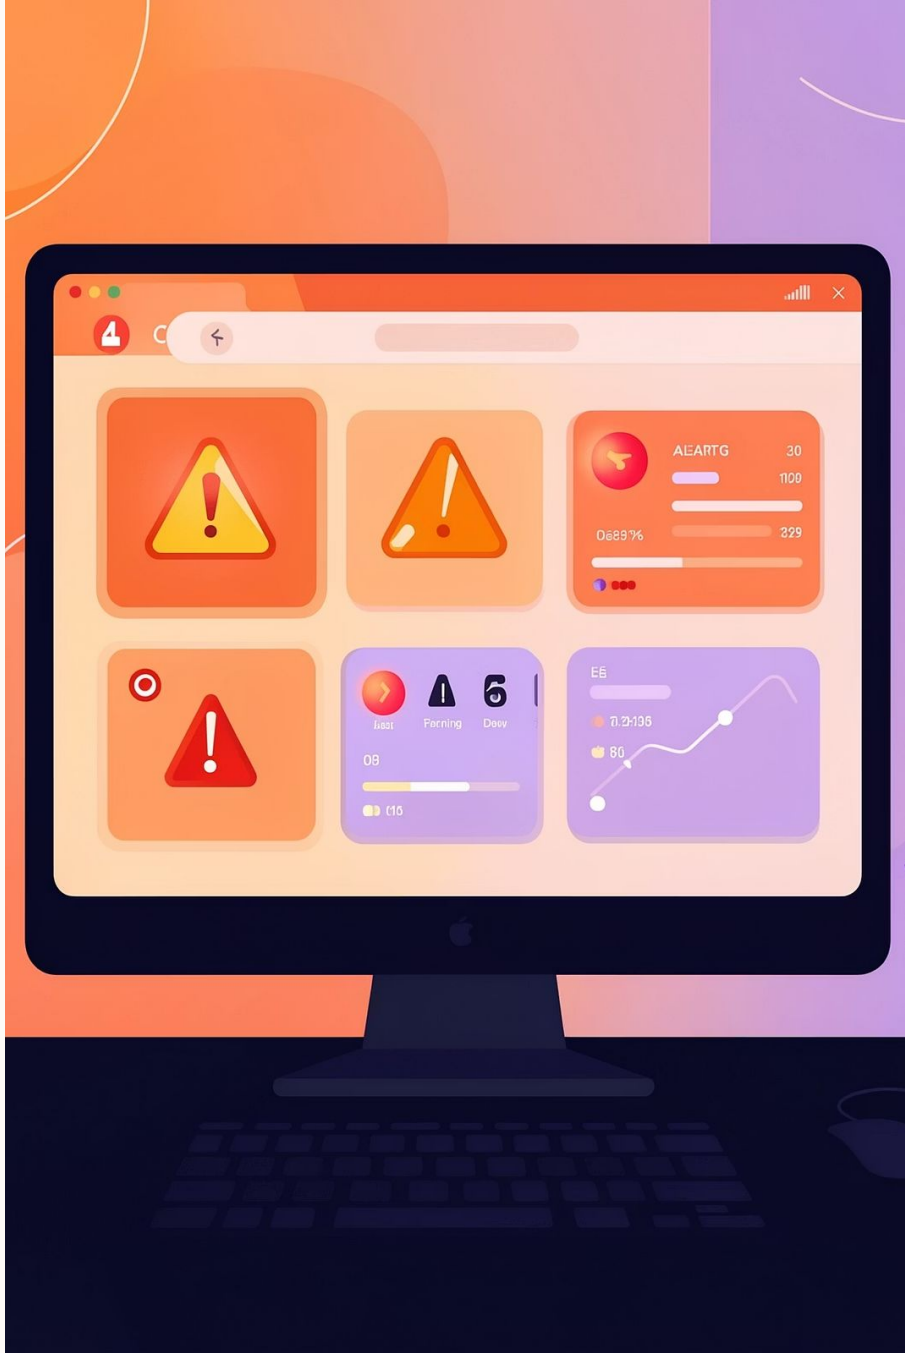

AI 洞察：战略一致性分析

🟡 战略 vs 运营比例

战略项目133.5h（49.2%）+ 付费项目40h（14.7%）= **63.9%有效投入**，基本合理但运营占比略偏高。

支持/运营类累计61.5h（22.7%），其中研究院行政22.5h + 院长助理21.5h合计占比**16.2%**，主要集中在李倩和魏超，对有效产出形成一定侵蚀。

🟡 重点项目投入度

科研数据中台

116h · 42.7% · 投入充足

龙岩生物银行

32h · 11.8% · 售前阶段

AgeLens 孵化

17.5h · 6.4% · 偏少

⚠ AgeLens作为高优先级战略孵化项目，本周仅17.5小时，且主要由兼职聂鑫承担，管理层直接投入不足。

AI 洞察：执行效率与碎片化

高度聚焦（技术研发）

张治宇日均1.0个项目，均值8h/任务；王晓书、杨星、聂鑫碎片化程度均较低，执行模式健康，深度工作时间充裕。

高度碎片化（运营行政）

李倩日均切换3.8个项目，29个任务条目，均值1.4h/任务；魏超日均2.8个项目，21条任务，均值1.5h，属结构性问题。

会议与协调成本

周一新员工培训消耗团队约12小时（一次性成本）；魏超全周协调类任务约18h，占总工时56%；胡若玫连续三天出差龙岩（24h），占本周工时57.8%。

建议后续工时填报中增加预估时长字段，以便识别低估/高估规律——本周无预估数据，无法计算偏差。

AI 洞察：健康风险与财务合规

🔴 团队健康风险

负荷分布不均

三名成员超负荷（王晓书143.8%、聂鑫133.3%、张治宇125%），技术骨干持续高压，存在可持续性风险。

数据质量问题

88条工时条目中**project_content字段全部为空**；王晓书10月23日出现两条同日同项目记录（6h+8h=14h），需核实。

知识单点依赖


张治宇全周100%专注数据中台，形成单点依赖风险。

🟡 财务与合规

付费+战略项目合计约**64%**，财务健康度基本良好。科研数据中台116h + AgeLens 17.5h = 133.5h具有潜在资本化（CapEx）价值。

主要风险点：

- 龙岩售前项目投入32h，转化节点尚不明确
- 国家数据局高优先级项目本周近乎停滞（仅2h）
- 李倩PPT素材库任务战略优先级存疑（9.5h）
- project_content全部为空，影响CapEx/OpEx精准判断

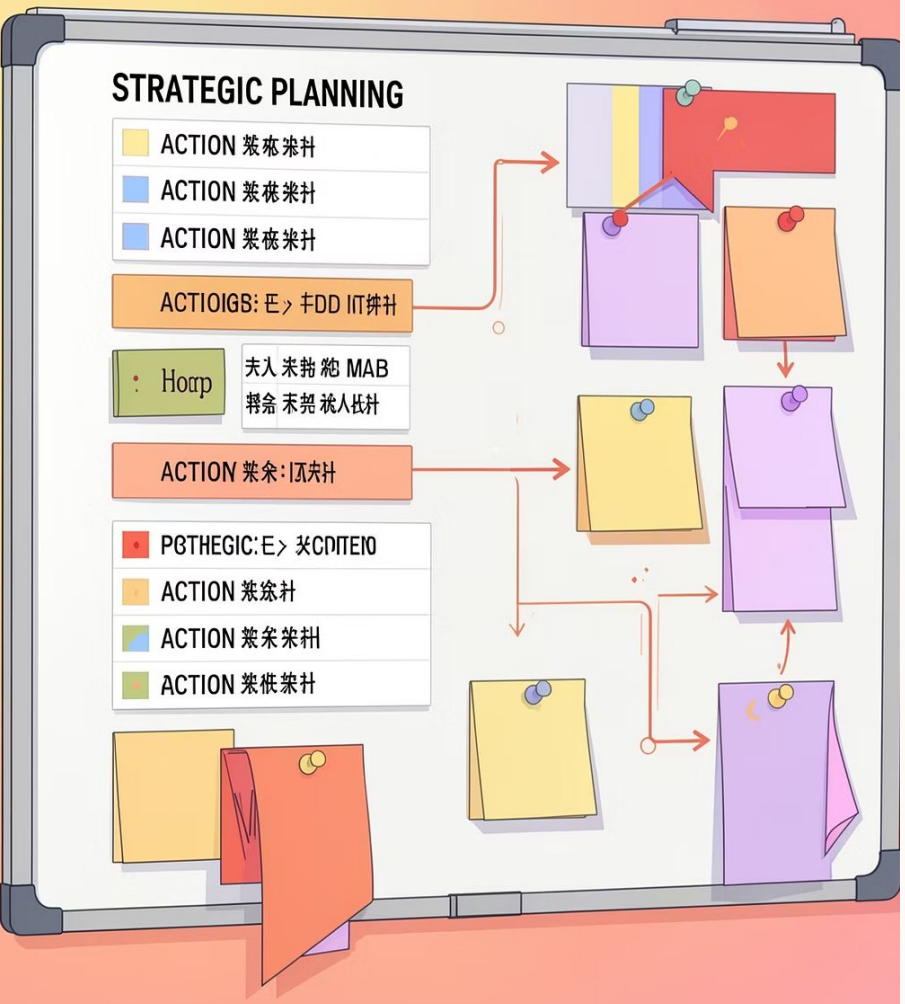

立即行动项

1 核实王晓书10月23日工时异常

确认同项目两条记录（6h+8h）是否为重复填报或实际加班14小时，确保数据准确，并审视数据中台任务量是否超出2人合理承载范围。

2 与聂鑫沟通月报工作节奏

避免集中于周末高强度完成，美年月报撰写计划应在周三前启动；评估24小时标准工时与实际交付需求的匹配度，必要时调整协议工时。

3 明确AgeLens本阶段里程碑

胡若玫每周为AgeLens预留固定时间块（建议≥8h/周）；明确算法交接后下一里程碑；对产品经理候选人加快决策节奏。

4 推进国家数据局专项课题结项

高优先级付费项目本周仅投入2小时，下周专项安排至少半天推进结项，明确材料清单和责任人，尽快完成验收以释放对应人力。

优化建议总览

优先级	类别	建议	预期效果
🔴 高	健康	建立兼职人员工作节奏规范，避免聂鑫周末超时集中交付	消除劳动合规风险，提升可持续工作能力
🔴 高	健康	核查技术核心成员超负荷问题，重点关注王晓书工时异常	降低核心人员离职或健康风险，规避单点依赖
🔴 高	战略	明确AgeLens孵化项目本阶段里程碑，增加管理层直接投入	确保战略孵化项目不因日常事务挤压而停滞
🟡 中	效率	优化魏超岗位职能结构，区分院长助理与项目管理职能	释放约8-10h/周的项目管理有效工时
🟡 中	效率	重新评估李倩工作内容配置，降低低价值行政事务占比	提升核心职能产出，减少碎片化认知切换损耗
🟡 中	战略	立即推进国家数据局专项课题结项，避免高优先级项目搁置	完成里程碑，推动尾款回收，释放管理注意力
🟢 低	财务	完善工时数据质量规范，强制填写project_content字段	提升分析精准度，支持CapEx判断，为季度复盘提供可靠数据

报告生成时间：2026-10-23 18:39:14 · 美年健康研究院 数据平台部
