



团队工时分析报告

分析周期：2026-06-01 至 2026-06-07 | 美年健康研究院 数据平台部
2026-06-05

本周核心数据一览

309h

总工时

全团队本周合计投入

18

涉及项目

跨项目协作广度

7

团队规模

全职+兼职+按需

6天

工作天数

本周实际工作日

📌 AI洞察：战略项目投入占比43%，表现良好。但存在王晓书严重超负荷（223.7%达成率）和工作分配不均问题。团队管理与行政事务占比偏高（15.7%），影响核心业务专注度。建议立即调整王晓书工作负荷并优化团队资源配置。

团队负荷状态分布

本周状态概览

✅ 正常负荷

5 人

⚠️ 超负荷


1 人

🔄 按需工作


1 人

姓名	总工时	达成率	状态
王晓书	89.5h	223.7%	⚠️ 超负荷
魏超	46.0h	115.0%	✅ 正常
胡若玫	40.5h	101.2%	✅ 正常
李倩	40.0h	100.0%	✅ 正常
张治宇	37.0h	92.5%	✅ 正常
未知	32.0h	N/A	🔄 按需
聂鑫	24.0h	100.0%	✅ 正常


TOP 10 项目工时投入

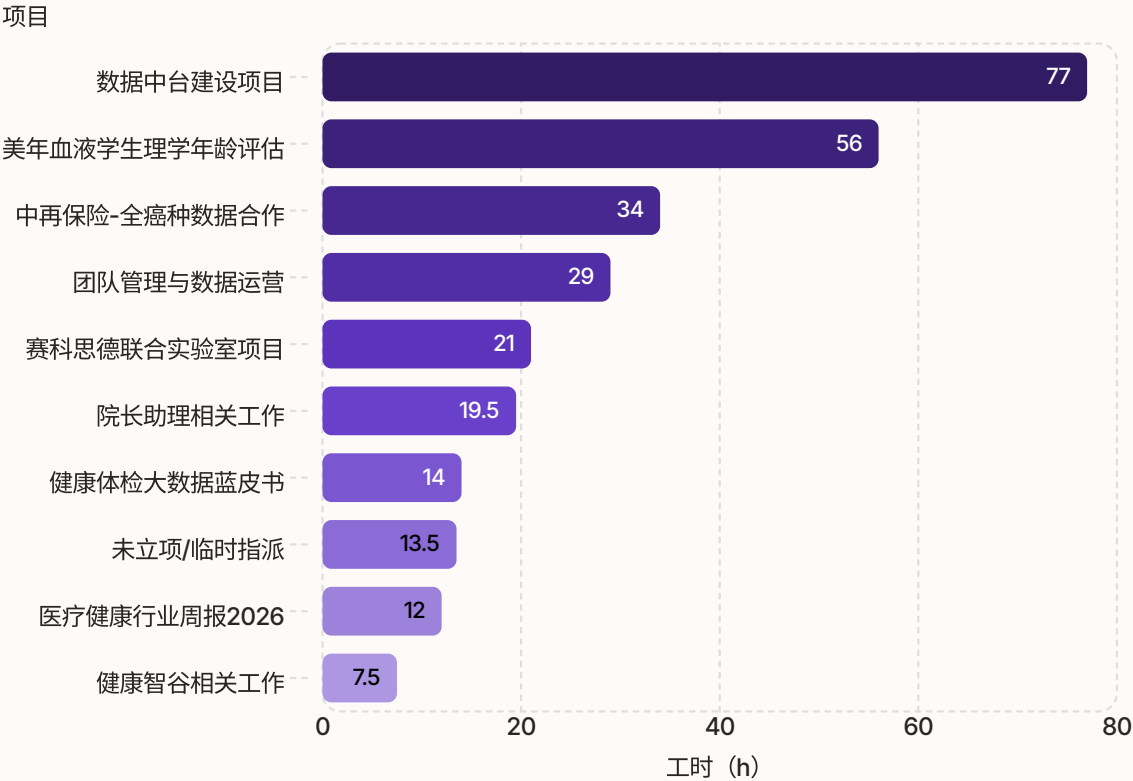

项目属性分布

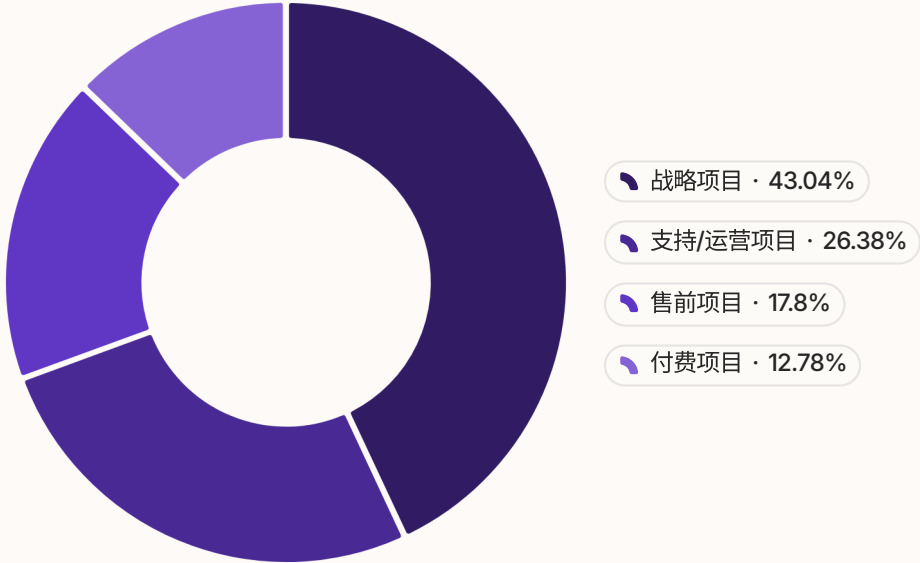

战略项目占比 **43%**，符合技术团队定位。

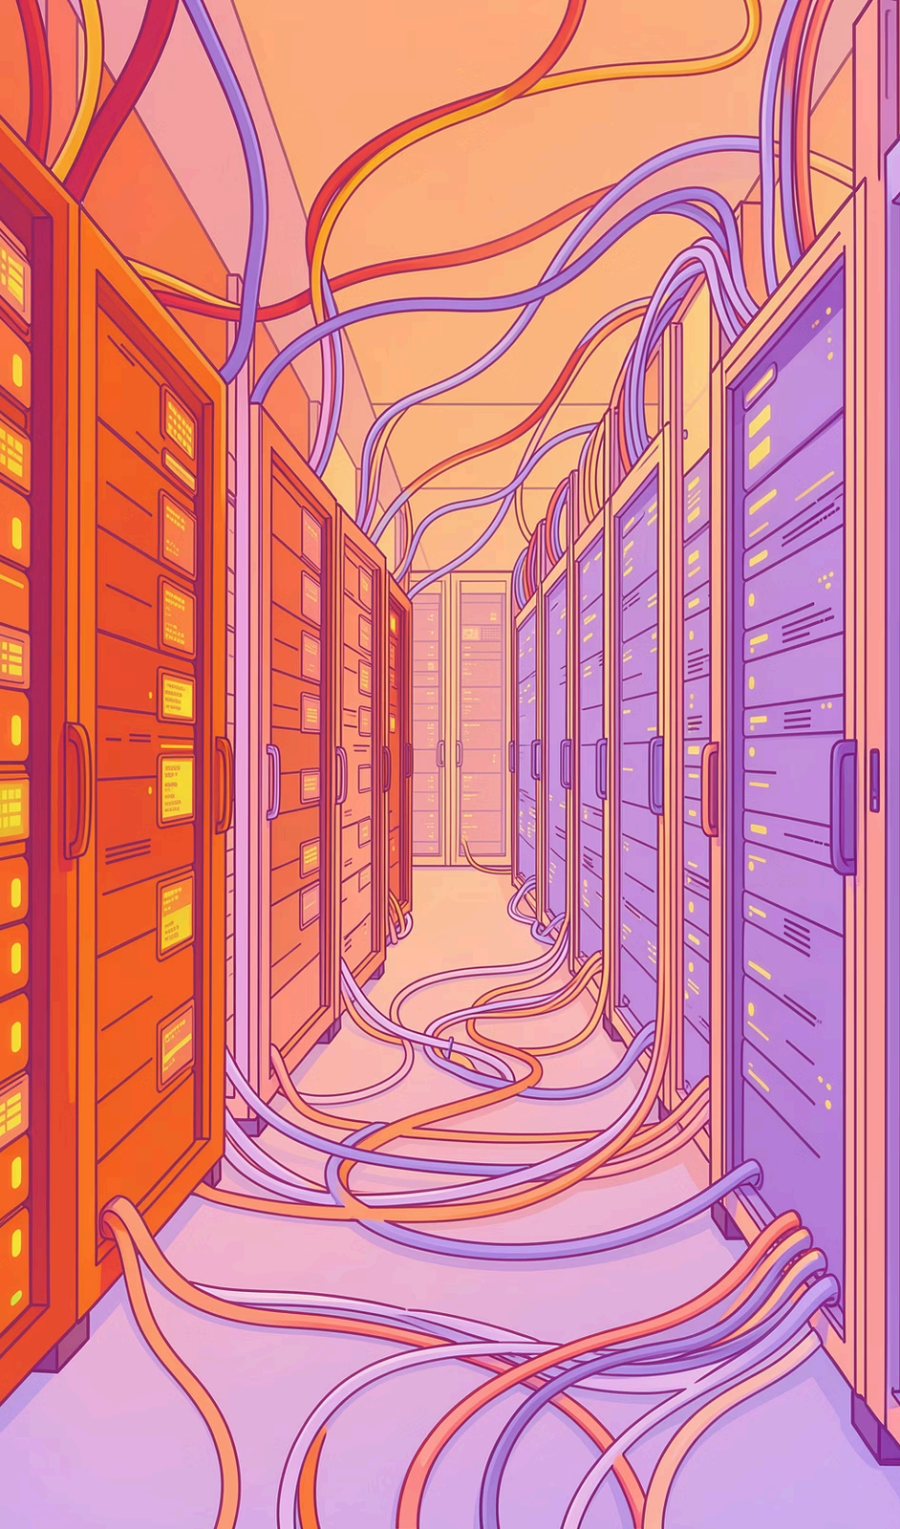

重点项目明细 1/3

数据中台建设项目

本周投入 **77.0h** (占比**24.9%**)，为全团队最高优先级战略项目，3人参与。

王晓书 (35.0h)

元数据管理与清洗配置模块研发 (25h)；BUG修改优化 (3h)；数据同步 stream load 技术问题解决 (3h)；元数据管理持续研发及数据清洗联动研发 (4h)

未知 (31.0h)

人工审核标准词归一结果300+条；检验归一标准表1000+条全量修改；2W+条匹配原始数据审核；更新标准词审核规范

张治宇 (11.0h)

DataEase部署与数据中台环境搭建 (7h)；ODS数据抽取，2025年数据抽取 (3h)；美兆数据统计 (1h)

美年健康血液学生理学年龄评估

本周投入 **56.0h** (占比**18.1%**)，3人参与，聚焦文献研究与模型构建。

胡若玫 (19.0h)


KDM模型文献研究 (8h);
PhenoAge模型文献研究 (8h);
制定文献综述工作计划与分工
(3h)

张治宇 (21.0h)

梳理美年健康数据 (8h); 数据提
取工作 (7h); 完成相关分析
(6h)

聂鑫 (16.0h)

研究可穿戴设备数据在健康管理中的应用 (8h); 检索血液学生理学年龄评
估相关论文 (8h)

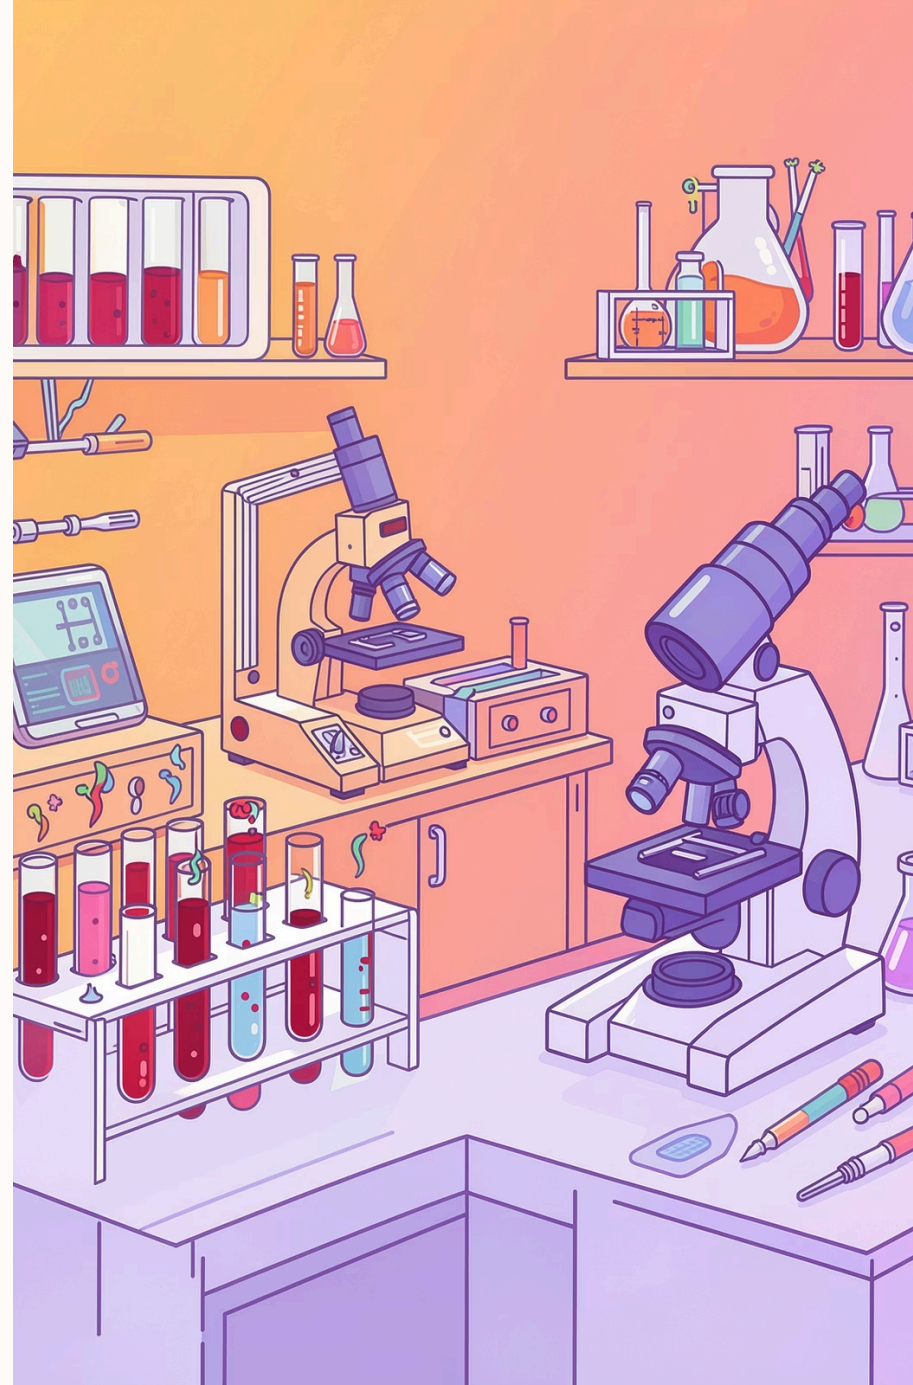

中再保险-全癌种数据合作 & 未立项工时

中再保险全癌种数据合作 (34.0h / 11.0%)

王晓书 (27.0h)

编写成本工时表 (25h); 多癌肿交流会议, 确认合作癌肿与指标 (2h)

魏超 (5.0h)

线上会议沟通交付与商务问题 (3.5h); 评估报价单并输出反馈 (1h); 咨询宫颈癌检项问题 (0.5h)

张治宇 & 未知 (各1.0h)

参加中再需求会议

⚠ 未立项/临时指派 (13.5h / 4.4%)

共7条任务, 涉及魏超、王晓书、胡若玫、张治宇

- 胡若玫: 超声公司产品路线研讨会 (4.0h)
- 张治宇: 超声相关数据统计 (4.0h)
- 王晓书: 业务培训+超声对接+影像服务器采买 (4.5h)
- 魏超: 海沁医疗合作机会沟通 (1.0h)

超负荷预警

王晓书：严重超负荷分析

单周实际工时 **89.5h**，达成率**223.7%**，标准工时仅40h，存在明显健康与质量风险。

项目	工时	任务数
数据中台建设项目	35.0h	5
中再保险-全癌种数据合作	27.0h	2
团队管理与数据运营	16.0h	8
赛科思德联合实验室项目	7.0h	2
未立项/临时指派	4.5h	4

⊗ 单点依赖风险：王晓书同时承担核心技术研发、商务支持与团队管理，任何一项延误均可能引发连锁风险，需立即分担任务。

战略一致性评估



● 战略项目占比

战略项目43%（数据中台77h + 美年血液学56h），符合技术团队定位。TOP3项目共167h，占总工时**54%**，资源投入充足。



● 管理岗碎片化严重

魏超日均切换3.5个项目（涉及11个项目，平均任务时长仅1.5h）；李倩日均4.4个项目，深度工作效率受损。



● 支持运营占比偏高

支持运营项目占比32%，主要集中在团队管理29h和院长助理工作19.5h，影响核心业务专注度，建议评估必要性。



● 会议协作合理

团队管理与协作29h，占9.4%，控制在合理范围内，主要包括周例会、战略研讨等必要沟通。

团队健康与财务合规评估

● 团队健康风险

隐性加班（高风险）

王晓书单周89.5h，
223.7%达成率，存在明显单点依赖风险，其他成员工时分布相对均衡。

临时指派（正常）

未立项工时13.5h
(4.4%)，控制在合理范围，主要为业务拓展和临时支持工作。

● 财务与合规

● 资本化工时（良好）

战略项目133h约占43%，
数据中台等基础设施建设项目具备资本化潜力，投入比例合理。

● 跨部门支持成本（偏高）

支持运营项目99h占32%，院长助理与团队管理等内部支持成本偏高，影响核心业务产出。

AI 预警



异常值警报与立即行动项

异常值警报

王晓书工时异常

当前值：89.5h
(223.7%)

关注点：严重超负荷，
存在健康和质量风险

"未知"人员异常

当前值：32h按需人员
关注点：身份不明确，
存在管理风险

✓ 立即行动项


- ☐ 立即调整王晓书工作负荷，分担部分任务给其他技术人员
- ☐ 明确"未知"人员身份和管理归属
- ☐ 评估院长助理工作的必要性和效率

下周计划

下周工时安排预览

预计总工时：**102.0 小时**，4名成员参与排班。


人员安排

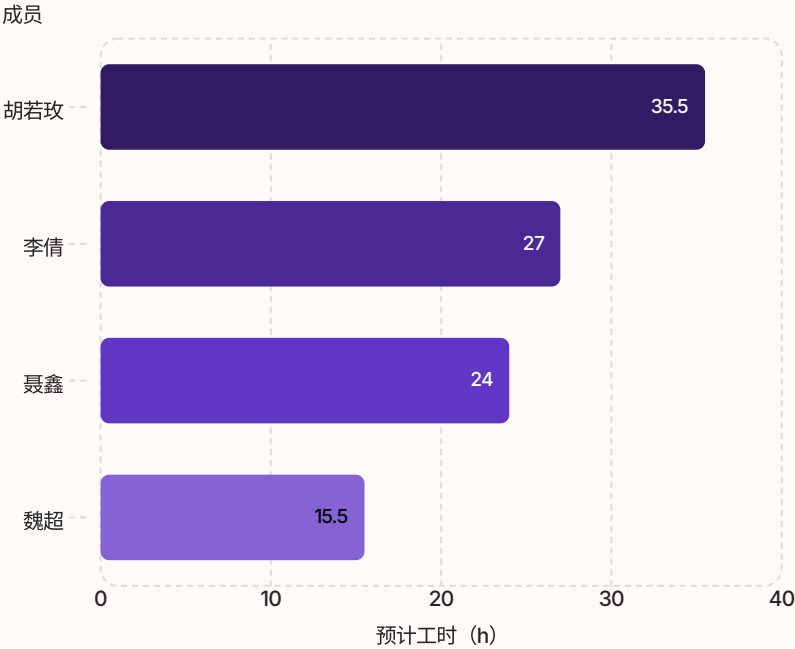

主要项目安排

项目名称	预计工时
院长助理相关工作	24.5h
团队管理与数据运营	19.0h
国家数据局数字化转型项目2024	16.0h
医疗健康行业周报2026	11.0h
美年健康血液学生理学年龄评估	8.0h
健康体检大数据蓝皮书	8.0h
内容运营与行业研究	8.0h
体检数据专家标注	4.0h

四项优化建议

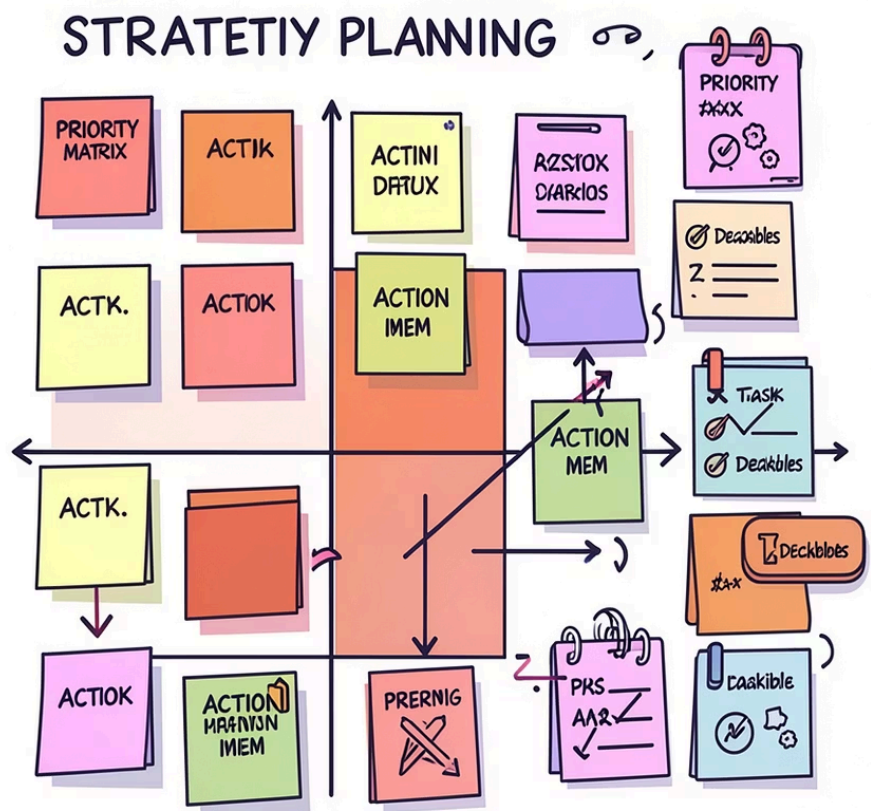

1 紧急调整王晓书工作负荷

1

单周89.5h严重超标，立即将部分数据中台和中再保险项目工作分配给张治宇或外部资源，降低人员流失与项目延期风险。

2 优化管理岗位工作模式

2

魏超日均切换3.5个项目，建议设立固定项目管理时间块，减少任务切换频率，提高管理效率与深度工作质量。

3 重新评估支持性工作优先级

3


团队管理和院长助理工作占用48.5h，建议评估必要性与效率，将更多资源投入核心技术项目，提升战略产出。

4 建立工时预估和跟踪机制

4

当前缺乏项目工时预估，建议建立标准预估流程，定期跟踪实际vs预估偏差，提高项目管理精度与资源配置效率。

总结与关键行动

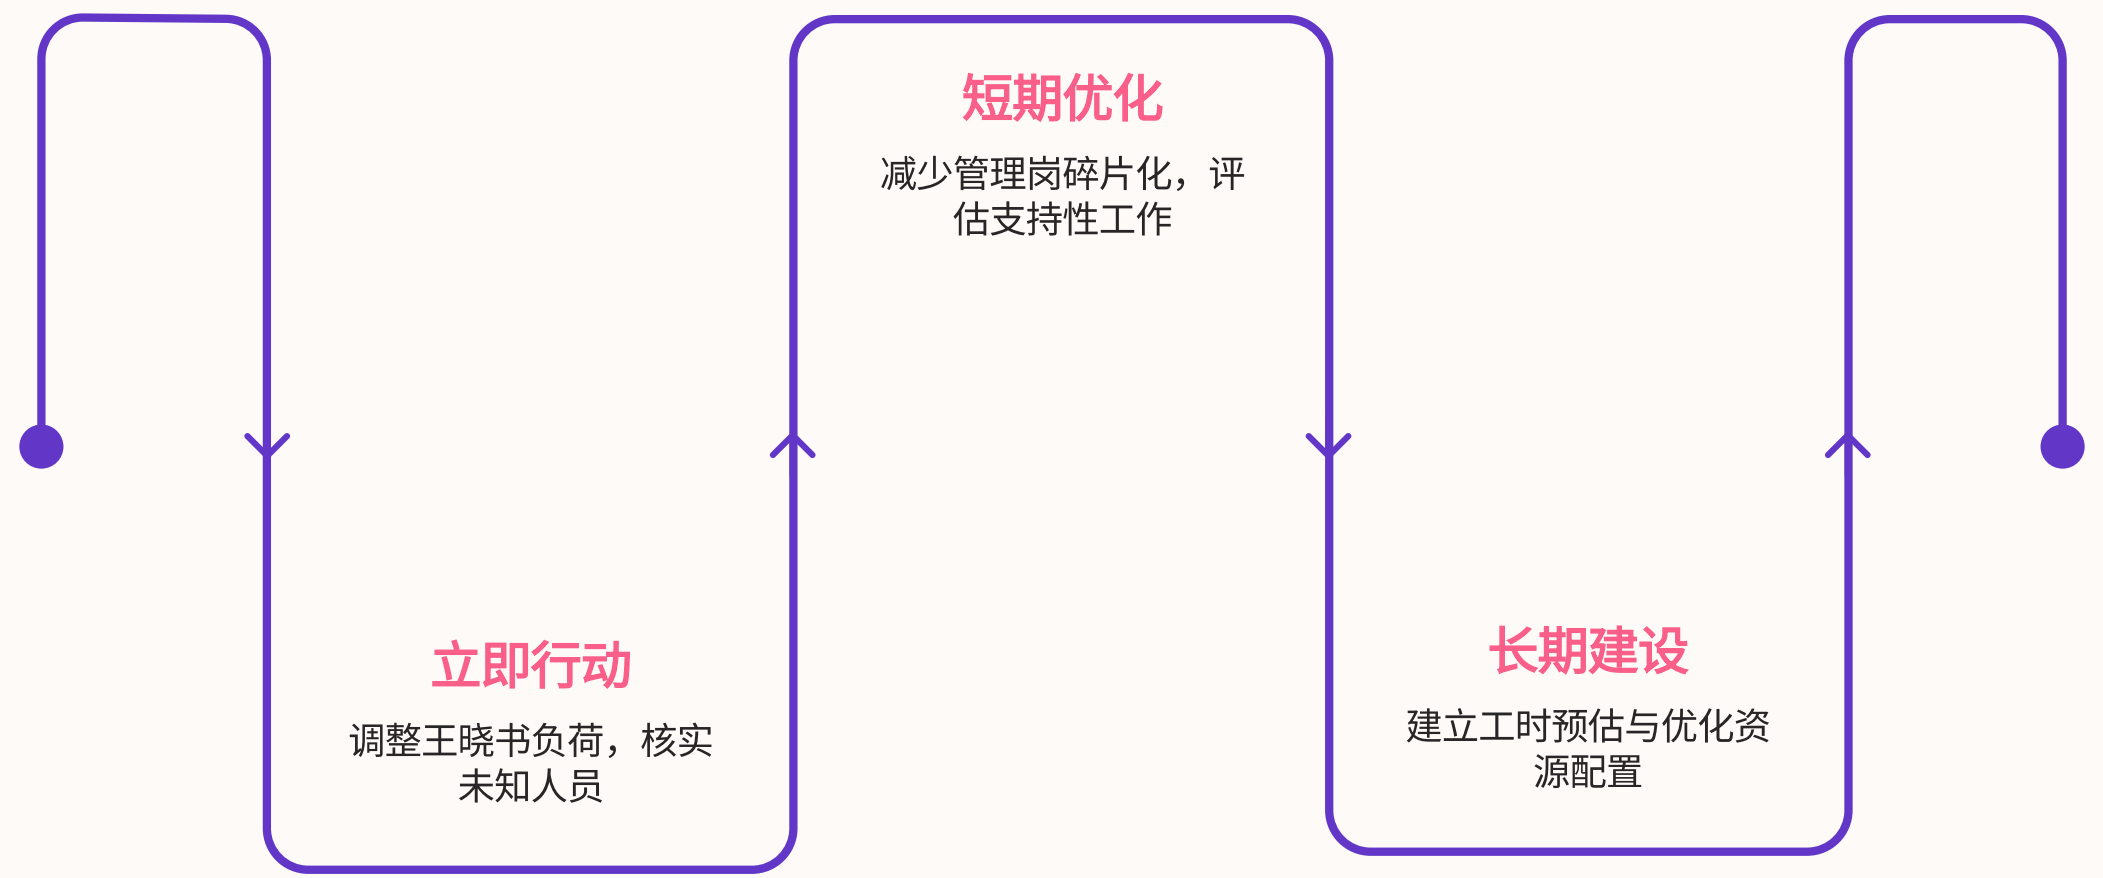

本周团队整体运转良好，战略项目投入比例达43%，重点项目资源充足。核心风险集中于王晓书单点超负荷（223.7%）与管理岗碎片化问题。建议按优先级逐步落实四项优化措施，确保团队可持续高效运转。
