

团队工时分析报告

分析周期：2026-09-21 至 2026-09-27 | 美年健康研究院 数据平台部 | 2026-09-24



执行摘要

216h

总工时

本周团队合计投入

5

工作天数

含中秋节假期

14

涉及项目

跨项目协作

7

团队规模

全职成员

核心亮点：科研数据中台平台研发（71小时，32.9%）作为最高优先级战略项目获得充分投入，张治宇、杨星、王晓书三名工程师专注度高。主要隐患：支持/运营类工时合计约66.5小时（占30.8%），叠加行政事务8小时，非战略投入偏高；聂鑫全周超标准工时25%。



正常负荷

6 人



超负荷

1 人



负荷偏低

0 人

人员工时总览


姓名	类型	总工时	标准工时	达成率	日均	任务数	状态
魏超	全职	32.5h	32.0h	101.6%	8.1h	18	正常
李倩	全职	32.0h	32.0h	100.0%	8.0h	24	正常
杨星	全职	32.0h	32.0h	100.0%	8.0h	4	正常
王晓书	全职	32.0h	32.0h	100.0%	8.0h	5	正常
张治宇	全职	32.0h	32.0h	100.0%	8.0h	4	正常
胡若玫	全职	31.5h	32.0h	98.4%	6.3h	8	正常
聂鑫	兼职	24.0h	19.2h	125.0%	8.0h	3	⚠️ 超负荷

项目投入总览

TOP 10 项目工时投入

#	项目名称	工时	占比	人数
1	科研数据中台·平台研发	71.0h	32.9%	4
2	团队与经营·运营职能	45.5h	21.1%	4
3	医疗健康行业·定期报告	27.5h	12.7%	3
4	院长助理相关工作	18.5h	8.6%	1
5	中再保险·四类癌症风险	9.0h	4.2%	2
6	思齐圈·专家标注·数据服务	8.5h	3.9%	2
7	研究院行政事务	8.0h	3.7%	1
8	AgeLens·公司孵化	8.0h	3.7%	1
9	研究院平面设计	7.5h	3.5%	1
10	中日友好医院·肺间质筛查	6.5h	3.0%	1

项目属性分布

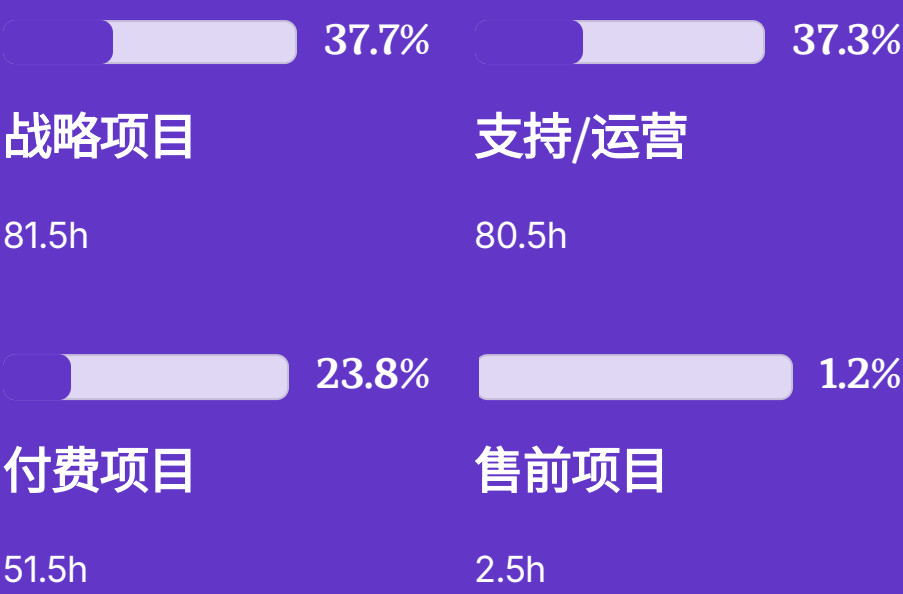

重点项目明细：科研数据中台（71.0h / 32.9%）

本周最高优先级战略项目，张治宇、杨星、王晓书三名工程师全力投入，资源充足。

杨星（32.0h）

全周专注检验字典标准内容调整（4×8h），并完成标准化数据核查与字典功能测试。

张治宇（24.0h）


中台"指标管理"模块全栈开发：前端页面实现（8h）→ 后端API开发（8h）→ 前后端联调与测试（8h）。

王晓书（14.0h）

中台数据仓库新流程数据推送质量验证：首轮（6h）+ 二轮（8h）。

李倩（1.0h）

跟进美置合同进度（0.5h）；跟进超声多模态大模型训练数据集构建合作协议签章与存档（0.5h）。

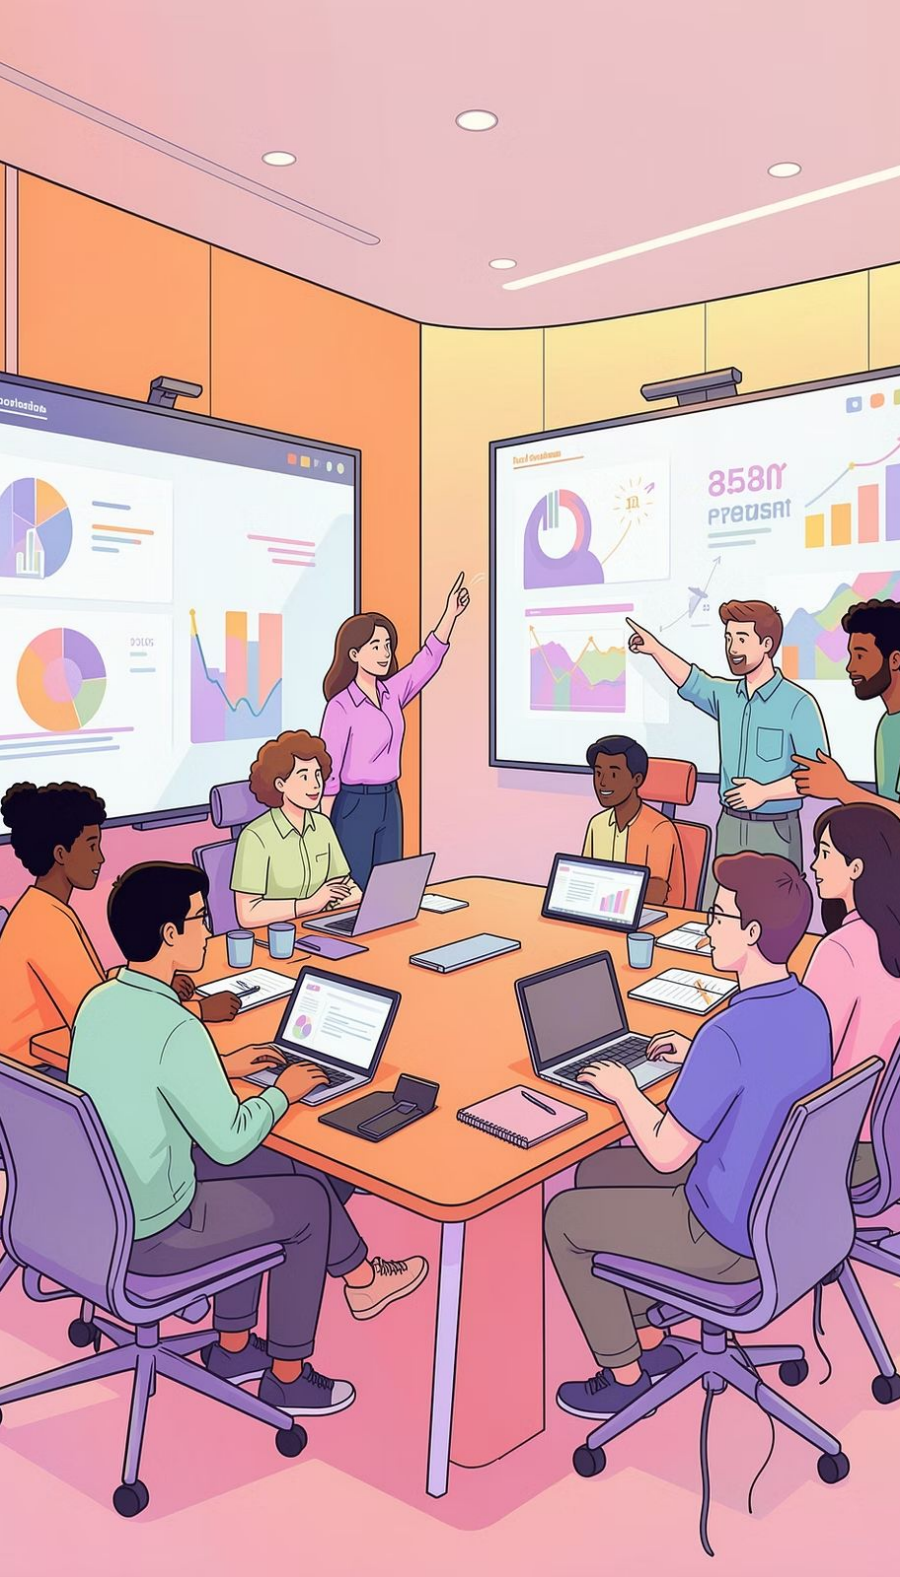

重点项目明细：运营职能 & 定期报告

团队与经营·运营职能 (45.5h)

- **胡若玫 (20.0h)**：数据平台部工作总结与规划 (8h)、AI人机协作培训与事实卡维护 (6h)、AI人机协同demo开发 (5.5h)、周例会 (0.5h)
- **王晓书 (18.0h)**：阶段汇报编写 (8h)、阿里云文件管理系统部署 (8h)、周例会 (2h)
- **魏超 (4.0h)**：部门内部培训 (2.5h)、开发者权限沟通 (1.5h)
- **李倩 (3.5h)**：参加AI原生团队workshop，学习Anthropic「人+智能体」协作最新实践

医疗健康行业·定期报告 (27.5h)

- **聂鑫 (16.0h)**：撰写9月专题解读 (8h)、医疗健康周报新闻采集及月报撰写 (8h)
- **胡若玫 (9.0h)**：新闻采集系统优化与维护 (8h)、9月专题审核 (0.5h)、周报审核 (0.5h)
- **李倩 (2.5h)**：跟进项目3期款进度、周报数据清洗 (4×0.5h)

⚠️ ⚠️ 未立项工时：李倩 1.0h
(发起美昱多模态超声数据集构建服务框架协议OA审批)，占全部工时0.5%。

超负荷人员分析：聂鑫

聂鑫 · 兼职 ·  超负荷

24h

实际工时

125%

达成率

标准工时 19.2h，超出约 25%。9月27日（中秋节法定假日）仍投入 **8小时** 撰写医疗健康周报月报，属于典型假日加班。

本周工时明细

项目	工时	任务数	具体事项
医疗健康行业 · 定期报告	16.0h	2	9月专题解读 + 月报撰写
AgeLens · 公司孵化	8.0h	1	衰老科学与行业动态周报整理

美年周报存在固定交付压力，需评估是否补偿或调整交付节奏。

下周工时安排

人员安排（预计总工时：78.5h）

张治宇 24.0h	王晓书 16.0h
杨星 16.0h	聂鑫 16.0h
胡若玫 4.0h	李倩 2.5h

主要项目

项目名称	预计工时
科研数据中台·平台研发	58.0h
医疗健康行业·定期报告	10.5h
AgeLens·公司孵化	8.0h
团队与经营·运营职能	2.0h

❏ 科研数据中台下周将占据 73.9% 的团队工时，工程师团队高度聚焦。

异常值警报

法定假日加班 — 聂鑫

2026-09-27（中秋节）工作8小时，全周达成率125%。兼职分析师在法定假日超标准工时25%，美年周报存在固定交付压力，需评估是否补偿或调整交付节奏。

法定假日工作 — 胡若玫

2026-09-27（中秋节）工作1小时进行内容审核。管理层在法定假日仍需审核内容，反映项目交付压力传导至假日。


碎片化严重 — 李倩

日均4.5个项目，任务均时仅1.3小时，全周参与8个项目。高度碎片化导致无法进入深度工作，行政事务占比过高与内容运营岗位定位存在偏差。

职责错位 — 魏超

院长助理相关工作18.5小时，占全周工时56.9%。项目经理角色本周超半数时间用于院长助理性质工作，项目管理和业务拓展职能严重受压。

战略一致性分析

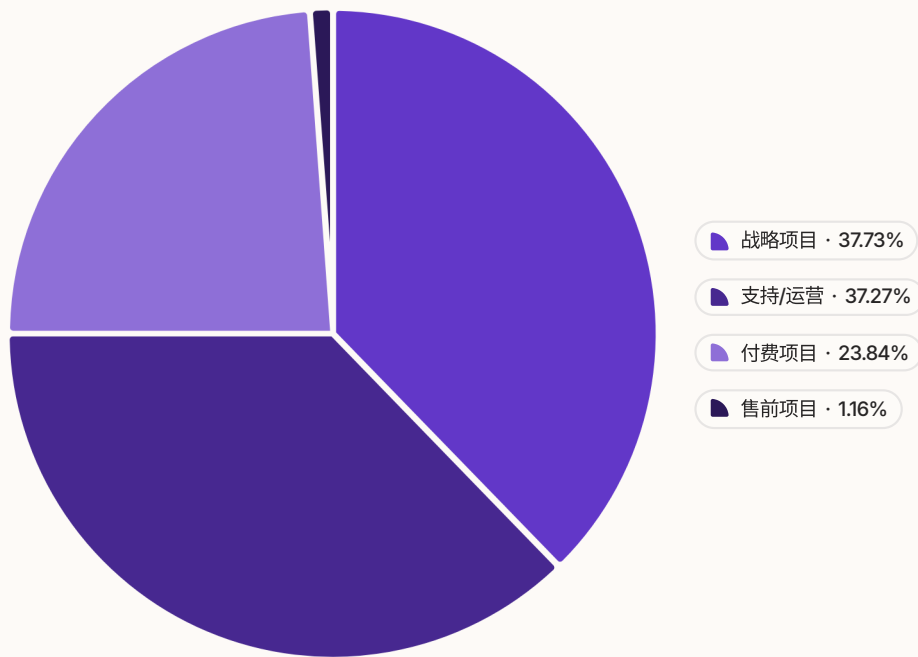

● 战略 vs 琐事比例

战略项目81.5h（37.7%）比例尚可，但运营支持（45.5h）与行政事务（8h）合计53.5h，加上院长助理工作18.5h，非直接产出支持性工时达**72小时**，超过三分之一，挤压深度工作时间。

● 重点项目投入度

科研数据中台资源充足（71h）。但AgeLens仅聂鑫1人投入8h做行业研究，缺乏多角色协作；美年研究型体检中心战略规划仅2.5h接待性质投入，实质性规划工作未见推进。两个高优先级战略项目资源严重不足。

执行效率与健康风险

● 碎片化程度

李倩

日均4.5个项目，任务均时1.3h，高度碎片化，几乎无法进入深度工作状态。

魏超

日均3个项目切换，任务均时1.8h，处于碎片化区间。

张治宇 / 杨星

日均1个项目，任务均时8h，执行模式优秀。

● 会议/协作占比

本周可识别会议与外出协作工时约**26小时**，包含周例会、中日友好医院外出（5h）、北邮接待（3h）、AI人机协作培训（胡若玫6h + 李倩3.5h + 魏超2.5h）。部分会议价值待评估。

● 单点依赖风险

杨星：全周32h 100%专注检验字典标准化，为科研数据中台唯一医学标准化执行人，无备份资源。入职仅3.5周（2026-09-02），独立承担核心医学标准化工作，存在培训期风险。

张治宇：中台指标管理模块主要开发者，中再保险项目也由其单独承接。若上述成员请假，相关进度将完全停滞。

● 数据透明度

全部66条工时记录的project_content字段均未填写，导致无法深入判断工作方向与战略价值。王晓书周四8h服务器部署工作分类存疑。

财务与合规分析

● 资本化工时占比

付费项目直接产生收入的工时仅占**26.9%**，支持/运营类工时占34.5%，意味着超三分之一的人力成本未直接产生外部收入。科研数据中台71h属于内部资本化投入，若未来能支撑更多付费项目则投入合理，但短期支持产出比偏低需关注。

● 跨部门支持成本

魏超18.5小时均为院长助理性质工作（票务订购、会议接待、合同OA推进等），跨部门支持成本偏高且集中于单人。李倩跨部门合同OA/行政事务约3小时。建议明确各类工时的CapEx/OpEx归属，优化资源分配结构。

⚠ 付费项目直接收入工时占比偏低（26.9%），支持运营成本过高。魏超大量时间投入院长助理职能，存在职责模糊和机会成本损失。



立即行动项

1 解决聂鑫假日加班合规问题

按劳动法安排3倍薪酬或调休；与美年客户协商调整报告交付窗口，避免固定在节假日前后；评估是否为周报项目增配资源。

2 重构李倩工作模式

将非内容类行政事务集中在每周固定半天处理；将合同跟进、报销等职责归属至行政岗；内容运营职能应从本周11.5h提升至20h以上。

3 明确魏超职责边界

对18.5h工作逐项分类，将纯行政性任务转移至专职行政人员，释放其项目管理产能，每周可释放8-12小时。

4 推进AgeLens与研究型体检中心战略项目

指定负责人，制定近4周里程碑；北邮接待后立即跟进合作框架文档；在周例会中列为固定汇报议题。

优化建议总览

优先级	类别	建议	预期效果
● 高	健康	解决美年周报假日交付压力，保障聂鑫合规用工	消除劳动合规风险，提升工作可持续性
● 高	效率	重构李倩工作模式，减少行政碎片化，回归内容运营核心职责	释放约8-10h/周用于内容创作
● 高	战略	为AgeLens和美年研究型体检中心制定明确推进计划	推动高优先级战略项目实质落地
● 中	效率	明确魏超职责边界，系统性转移院长助理行政工作	每周释放8-12h用于核心项目管理
● 中	健康	建立杨星工作知识备份机制，消除医学标准化单点依赖	降低单点风险，加速新成员成长
● 中	效率	强制要求填写project_content字段，提升工时数据分析价值	支持更精准的资源配置与CapEx/OpEx核算
